

Informacja z realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Pniewy w 2021 roku

Urząd Miejski Pniewy
ul. Dworcowa 37
62 – 045 Pniewy



Referat inwestycji i gospodarki przestrzennej



⦿ Zakres zadania

Zadanie dotyczy realizacji pierwszego etapu rewitalizacji miasta Pniewy. Inwestycja obejmuje niżej wymienione zadania.

- **CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DAWNEJ HARCÓWCE**
- **RENOWACJA PAŁACU (BUDYNEK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO) W PNIEWACH I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ**
- **ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W PNIEWACH:**
 - 1) Przebudowa ulicy Św. Ducha w Pniewach w rejonie skrzyżowania z ul. Wolności i Lwówecką wraz z miejscami postojowymi przy Liceum Ogólnokształcącym i Ośrodku Pomocy Społecznej
 - 2) Przebudowa ul. Św. Ducha w Pniewach od Rynku do zakresu objętego wykonanym wcześniej, odrębnym opracowaniem określonym w pkt. 1

⦿ Całkowity koszt realizacji zadania:

15 900 076,77 zł

⦿ Maksymalna wysokość dofinansowania:

10 695 626,40 zł



> **CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DAWNEJ HARCÓWCE**

Zadanie obejmuje wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy wraz z rozbudową tzw. harcówki na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy w standardzie pasywnym z zagospodarowaniem terenu, drogą pożarową, dojazdem do ulicy Turowskiej oraz chodnikiem do ul. Wolności w Pniewach.

> Termin realizacji: **do 25 października 2021 r.**

> Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane REMBUD Leon Gzyl Sp. j.,
ul. Kacza 17/41, 60 – 106 Poznań**

> Wartość umowy: **7 193 475,31 zł**

> Wysokość dofinansowania: **5 368 465,08 zł**

> Etap realizacji: **zakończono roboty budowlane, trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu**

> Roboty dodatkowe i zamienne: wykonanie ogrodzenia terenu - 139 475,31 zł



Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I



2019 r.



Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

październik
2020 r.



Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

czerwiec
2021 r.




Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

wrzesień
2021 r.



Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

wrzesień
2021 r.

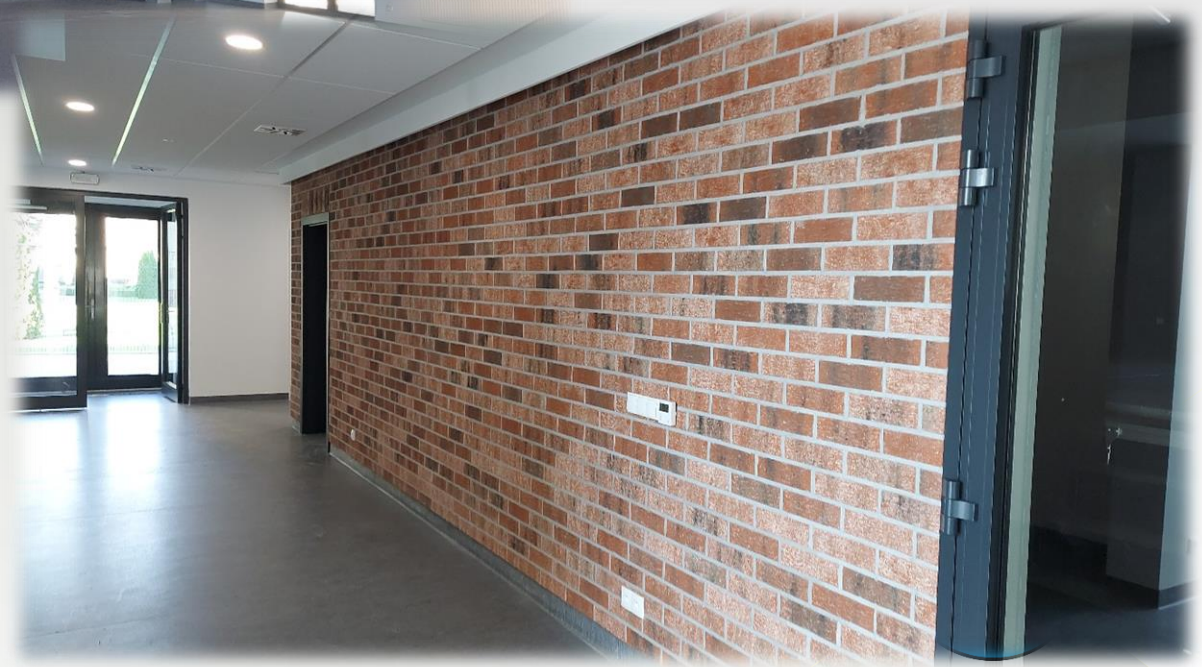

> **RENOWACJA PAŁACU (BUDYNEK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO) W PNIEWACH I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ.**

Zadanie obejmuje wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” renowacji pałacu (siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach) - remont elewacji, ewentualne wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej oraz opaski żwirowej wokół budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu: wykonanie nowych utwardzeń ścieżek, uporządkowanie zieleni, częściowe oświetlenie parku wraz z zamontowaniem szafek zasilających oraz małą architekturę.

- > Termin realizacji: **do 15 listopada 2021 r.**
- > Wykonawca: **GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Strzelecka 18 G, 62-045 Pniewy**
- > Wartość umowy: **5 026 148,74 zł**
- > Wysokość dofinansowania: **3 258 653,41 zł**
- > Etap realizacji: kontynuowane są roboty budowlane



> **RENOWACJA PAŁACU (BUDYNEK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO) W PNIEWACH I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ.**

> Roboty dodatkowe i zamienne na dzień 22. 10. 2021 r.:

- wzmocnienie konstrukcyjne ok. 1/3 murów budynku (uzupełnienie zaprawy szycie murów i nadproży prętami ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie murów siatką stalową) wraz z wymianą uszkodzonych cegieł, wykonanie nowej płyty balkonowej wraz z balustradami - 104 572,74 zł,
- zmiana części, wskazanych w Programie funkcjonalno – użytkowym, utwardzeń z nawierzchni Hanse Grand na nawierzchnię z kostki betonowej ok. 1380 m² oraz wykonanie dodatkowej kanalizacji deszczowej w rejonie sali gimnastycznej - 433 453,60 zł



Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

2020 r.



Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

luty
2021 r.



Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I



lipiec
2021 r.



Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

wrzesień
2021 r.



Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

wrzesień
2021 r.



> ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W PNIEWACH

- 1) Przebudowa ulicy Św. Ducha w Pniewach w rejonie skrzyżowania z ul. Wolności i Lwówecką wraz z miejscami postojowymi przy Liceum Ogólnokształcącym i Ośrodku Pomocy Społecznej,
- 2) Przebudowa ul. Św. Ducha w Pniewach od Rynku do zakresu objętego wykonanym wcześniej, odrębnym opracowaniem określonym w pkt. 1.

W ramach ww. zadań wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz przebudowano sieć energetyczną. Ponadto utworzono parking B&R i ciągi piesze z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

> Termin odbioru zadań: **28 grudnia 2020 r.**

> Wykonawca: **GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Strzelecka 18 G,
62-045 Pniewy**


> Wartość umowy: **3 052 824,64 zł**

> Wysokość dofinansowania: **2 068 507,90zł**



Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

PRZED
REALIZACJĄ

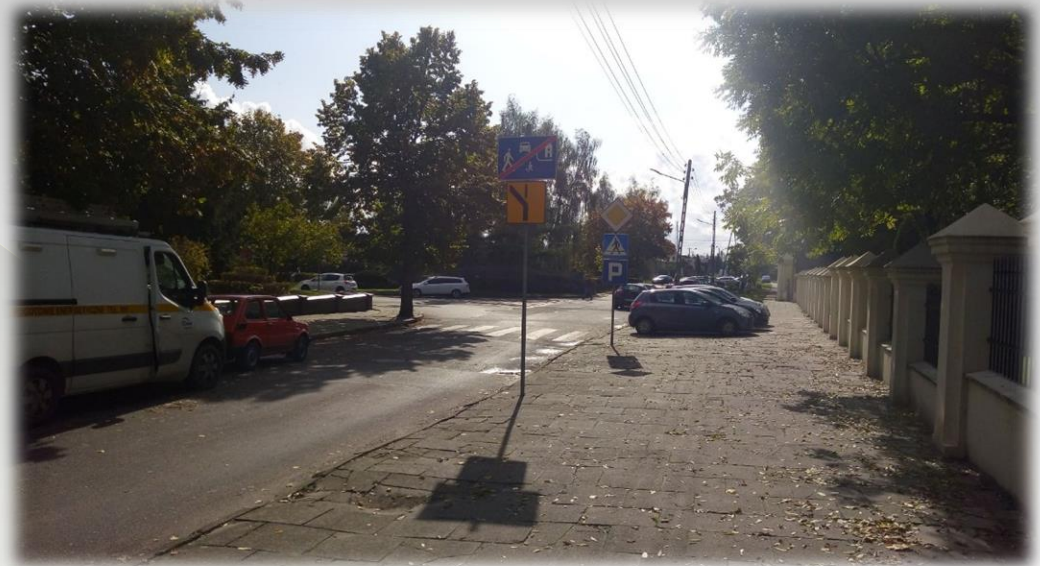


Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

PO
REALIZACJI




Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

PO
REALIZACJI

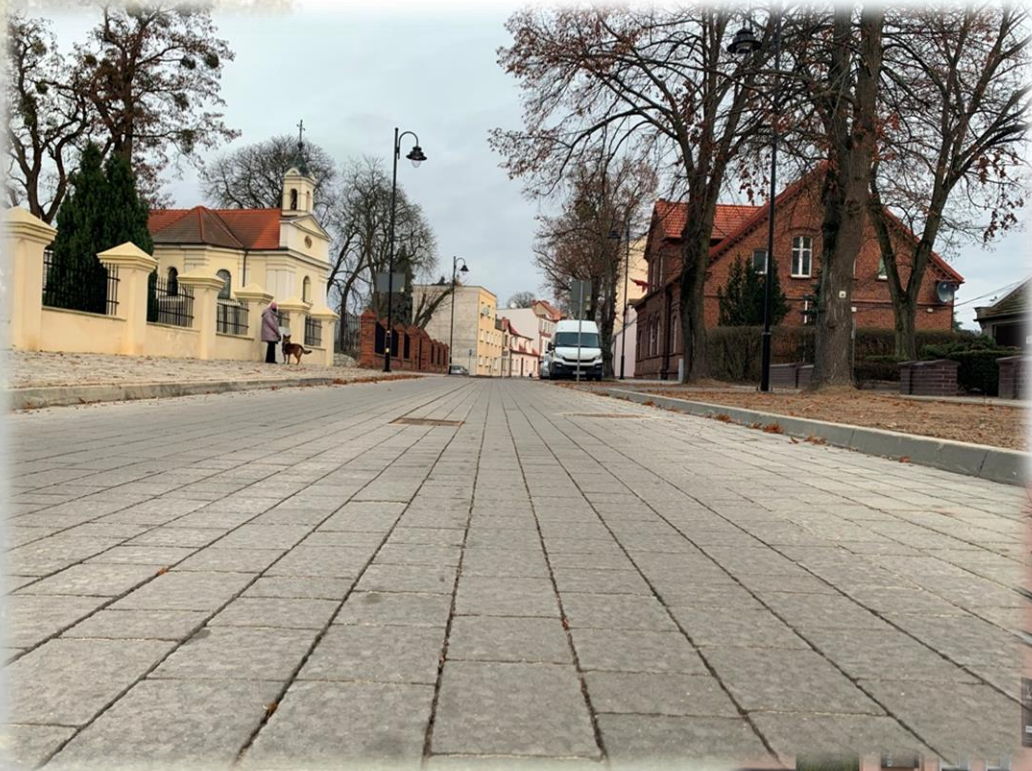

Podsumowanie – zakładane koszty realizacji Inwestycji Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

Lp.	Zadanie	Dofinansowanie	Wkład własny	Całość
1	CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DAWNEJ HARCÓWCE	5 368 465,09 zł	1 825 010,22 zł	7 193 475,31 zł
2	RENOWACJA PAŁACU (BUDYNEK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO) W PNIEWACH I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ	3 258 653,41 zł	1 767 495,33 zł	5 026 148,74 zł
3	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W PNIEWACH	2 068 507,90 zł	984 316,74 zł	3 052 824,64 zł
4	Nadzór inwestorski	- zł	377 865,47 zł	377 865,47 zł
5	Koszty pozostałe*	- zł	249 762,61 zł	249 762,61 zł
SUMA		10 695 626,40 zł	5 204 450,37 zł	15 900 076,77 zł

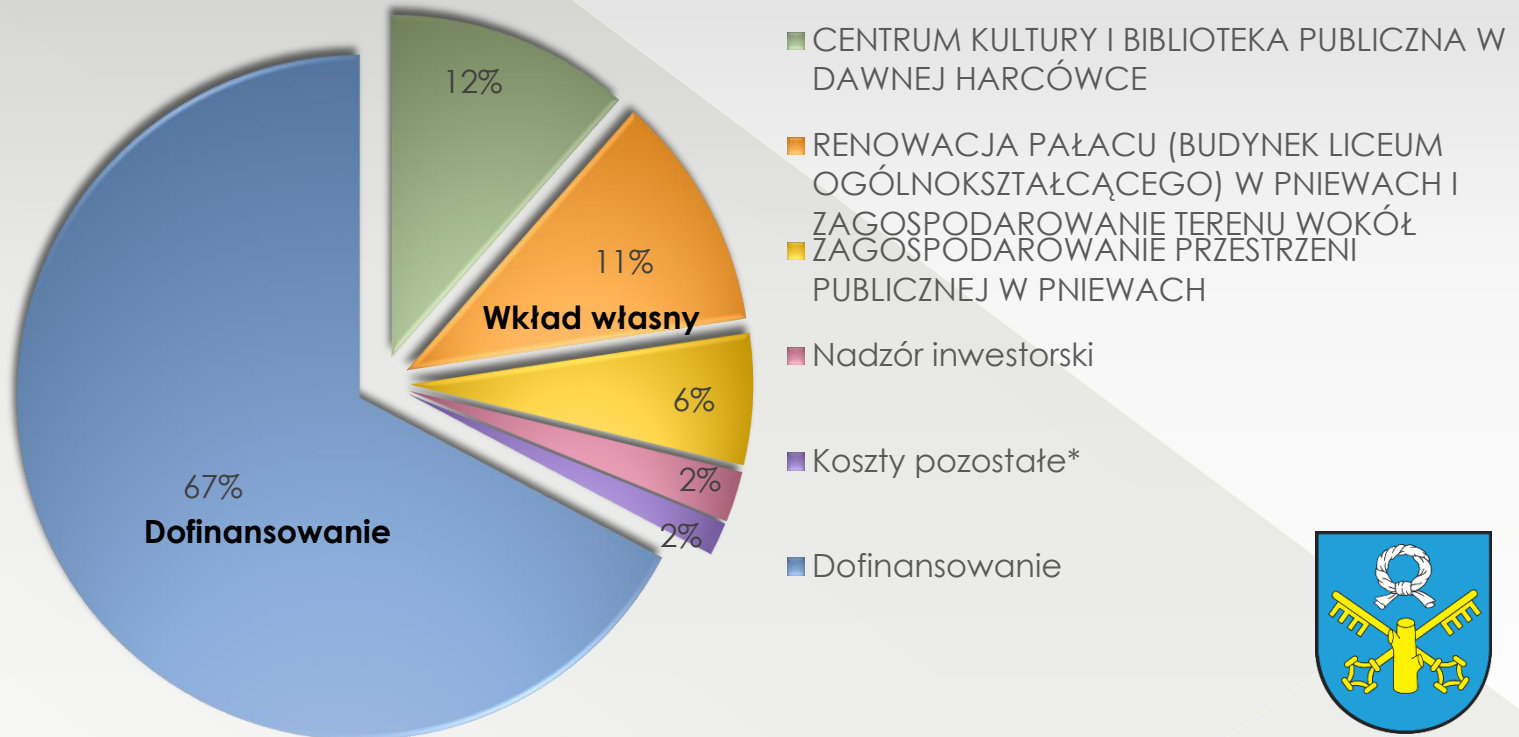

* Koszty pozostałe - nadzór autorski, koszty bieżące

Wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków pałacu, sali gimnastycznej oraz bursy w Pniewach **-ZADANIE ZREALIZOWANE**

◉ Zakres zadania


Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji teletechnicznej na głębokości 0,8 m z rur $\varnothing 110$ mm i $\varnothing 50$ mm wraz ze studniami kablowymi teletechnicznymi.

>Data odbioru zadania: **8 kwietnia 2021 r.**

>Wykonawca:

**GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe,
ul. Strzelecka 18 G, 62-045 Pniewy**

>Wartość umowy: **87 893,22 zł**

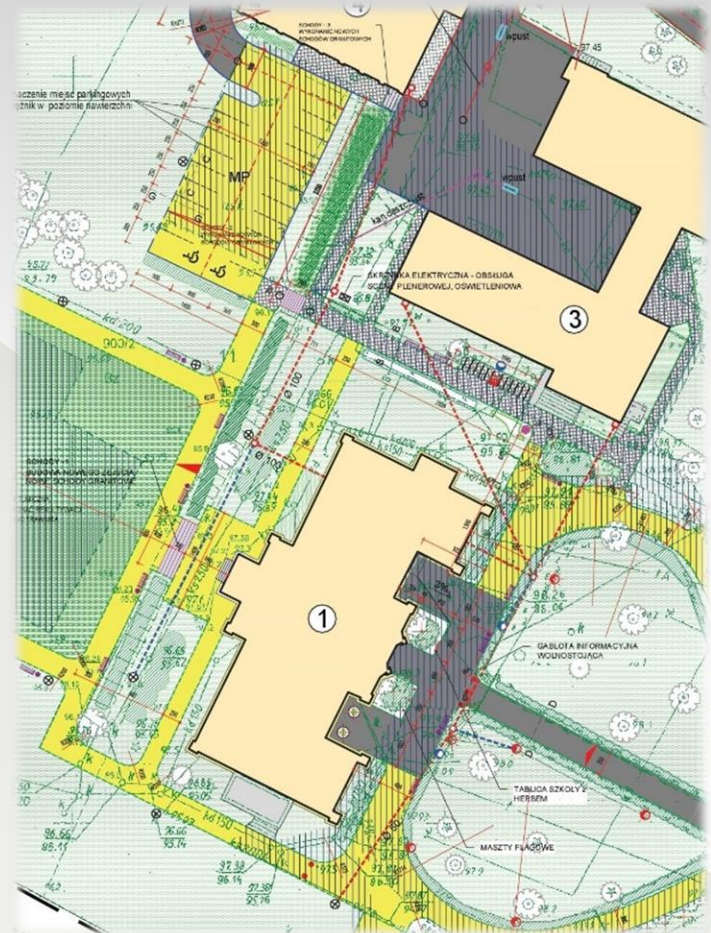

Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej

Zakres dofinansowanego projektu został wykonany w dwóch etapach:



ETAP I

1. Zintegrowane centrum przesiadkowe w rejonie ulic Pocztowej i Poznańskiej.
2. Ciąg rowerowy w rejonie drogi wojewódzkiej nr 187, ulice Wroniecka, Dworcowa i Pocztowa.
3. Zatoki autobusowe przy istniejącej drodze rowerowej w rejonie ul. Poznańskiej.

›Okres realizacji prac: **2017 r.**

›Wykonawca: **GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Strzelecka 18 G, 62-045 Pniewy**

›Koszt realizacja etapu I: **4 976 759,81 zł**

›Refundacja dofinansowania za ww. prace wpłynęła **22.12.2020 r.** w wysokości **2 650 168,66 zł**



Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej

ETAP II

1. Ciąg rowerowy w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Jeziornej wraz z oświetleniem ulicznym.
2. Ciąg rowerowy w rejonie Szkoły Podstawowej w Pniewach.
3. Parkingi B&R oraz dla rowerów miejskich w rejonie ul. Poznańskiej, ul. Ledóchowskiej, Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pniewach.
4. Oznakowanie ciągu rowerowego w rejonie ulicy Targowej.

>Termin odbioru zadań: **30 lipca 2021 r.**

>Wykonawca: **Zakład Robót Inżynieryjnych Produkcyjno Usługowo Handlowy Mieczysław Szczechowiak, ul. Konińska 28, 62-045 Pniewy**

>Wartość umowy: **762 477,27 zł**

>Wysokość dofinansowania: **249 368,98 zł**



Ciąg rowerowy w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Jeziornej wraz z oświetleniem ulicznym

PRZED
REALIZACJĄ



Ciąg rowerowy w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Jeziornej wraz z oświetleniem ulicznym

maj
2021 r.



Ciąg rowerowy w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Jeziornej wraz z oświetleniem ulicznym

czerwiec
2021 r.



Ciąg rowerowy w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Jeziornej wraz z oświetleniem ulicznym

PO
REALIZACJI



Ciąg rowerowy w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Jeziornej wraz z oświetleniem ulicznym

PO REALIZACJI



Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej

4. Dostarczenie rowerów miejskich wraz z systemem informatycznym do ich obsługi.
 - > Termin odbioru: **13 września 2021 r.**
 - > Wykonawca: **Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Roovee Spółka Akcyjna, ul. Ryżowa 33A lok. 7, 02-495 Warszawa**
 - > Wartość umowy: **833 478,75 zł**
 - > Wysokość dofinansowania: **373 744,20 zł**
 - > Przewidywany koszt całkowity zadań realizowanych w 2021 r. wraz z promocją projektu oraz nadzorem inwestorskim - ok. 1 650 000,00 zł
 - > Przewidywane dofinansowanie zadań realizowanych w 2021 r. wraz z promocją projektu oraz nadzorem inwestorskim - **655 282,64 zł**



Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej-




Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej-



Podsumowanie – koszty realizacji inwestycji w 2021 r. Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej

Lp.	Zadanie	Dofinansowanie	Wkład własny	Całość
1	Zakres robót budowlanych wykonanych w 2021 r. (parkingi B&R oraz dla rowerów miejskich, ciągi rowerowe)	249 368,98 zł	513 108,29 zł	762 477,27 zł
2	Darmowe rowery miejskie	373 744,20 zł	459 734,55 zł	833 478,75 zł
3	Promocja projektu	28 951,00 zł	5 109,00 zł	34 060,00 zł
4	Nadzór inwestorski i koszty pozostałe	3218,46 zł	16 765,52 zł	19 983,98 zł
SUMA		655 282,64 zł	994 717,36 zł	1 650 000,00 zł

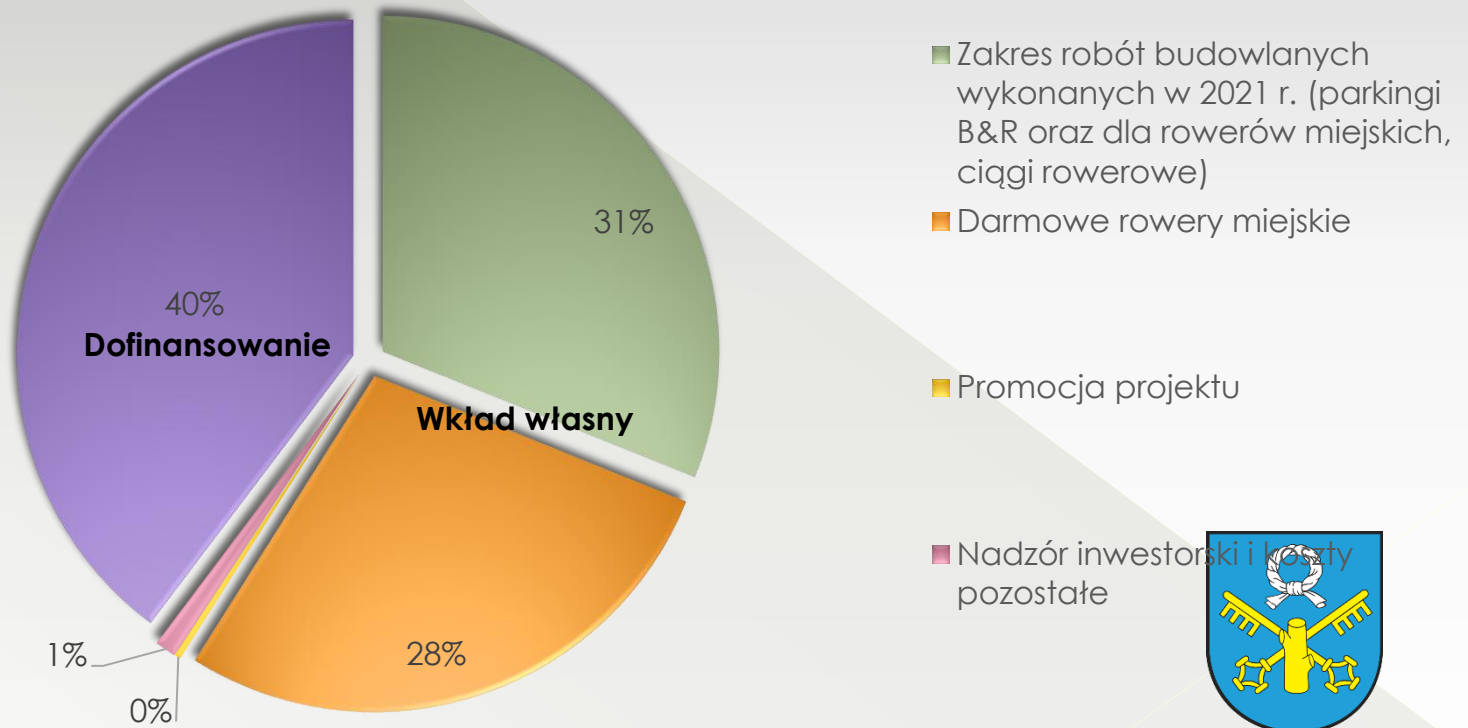

* Koszty pozostałe - nadzór autorski, koszty bieżące



Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokola” w Pniewach

⦿ Zakres zadania

Zadanie obejmuje:

- wykonanie pergoli,
- budowę budynku toalety wraz z montażem kontenera sanitarnego,
- wykonanie alejek i ścieżek oraz ścieżki rowerowej,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego,
- budowę bramy wejściowej,
- montaż elementów placu zabaw oraz placu Street Workout,
- montaż elementów małej architektury – ławek, koszy, tablic, stolików szachowych, itp.,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetlenia parku.

› Termin realizacji: **do 14 grudnia 2021 r.**

› Wykonawca: **GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Strzelecka 18 G,
62-045 Pniewy**

› Wartość umowy: **4 459 432,13 zł**


› Wysokość dofinansowania: **3 718 841,00 zł**

› Etap realizacji: **roboty budowlane**



Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokola” w Pniewach

Lp.	Zadanie	Dofinansowanie	Wkład własny	Całość
1	Roboty budowlane	3 718 841,00 zł	740 591,13 zł	4 459 432,13 zł
2	Nadzór inwestorski i koszty pozostałe*	- zł	75 562,66 zł	75 562,66 zł
SUMA		3 718 841,00 zł	816 153,79 zł	4 534 994,79 zł

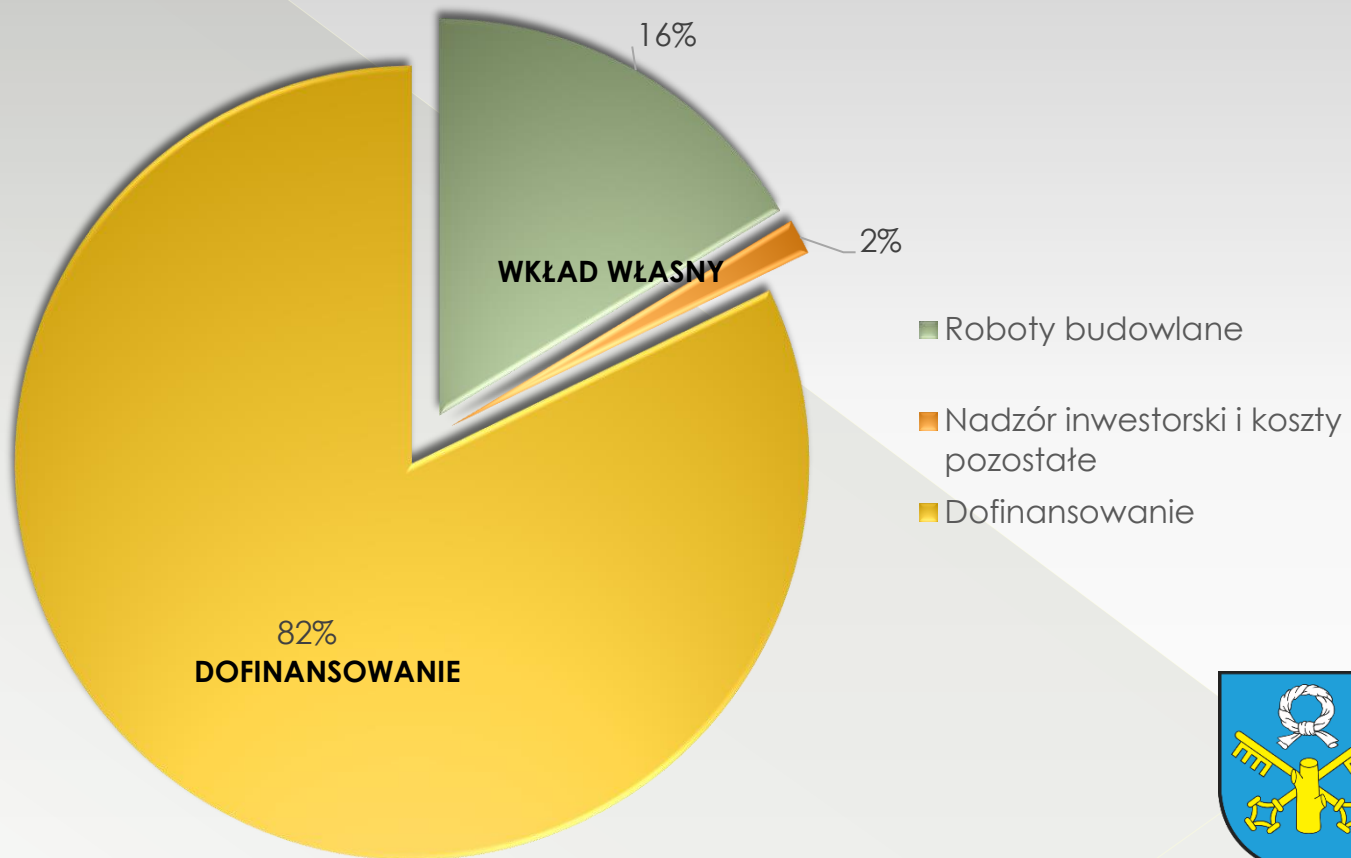

* Koszty pozostałe - nadzór autorski, koszty bieżące

Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokola” w Pniewach

maj
2021 r.



Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokół” w Pniewach

sierpień
2021 r.



Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokół” w Pniewach

wrzesień/
październik
2021 r.



Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokół” w Pniewach


wrzesień/
październik
2021 r.



Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokola” w Pniewach


Problemy napotkane na etapie realizacji

Podczas prowadzenia prac ziemnych stwierdzono występowanie głębokich warstw gruntów organicznych. W celu zapewnienia odpowiedniego zagęszczenia gruntu pod projektowane warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni konieczna jest wymiana gruntu.

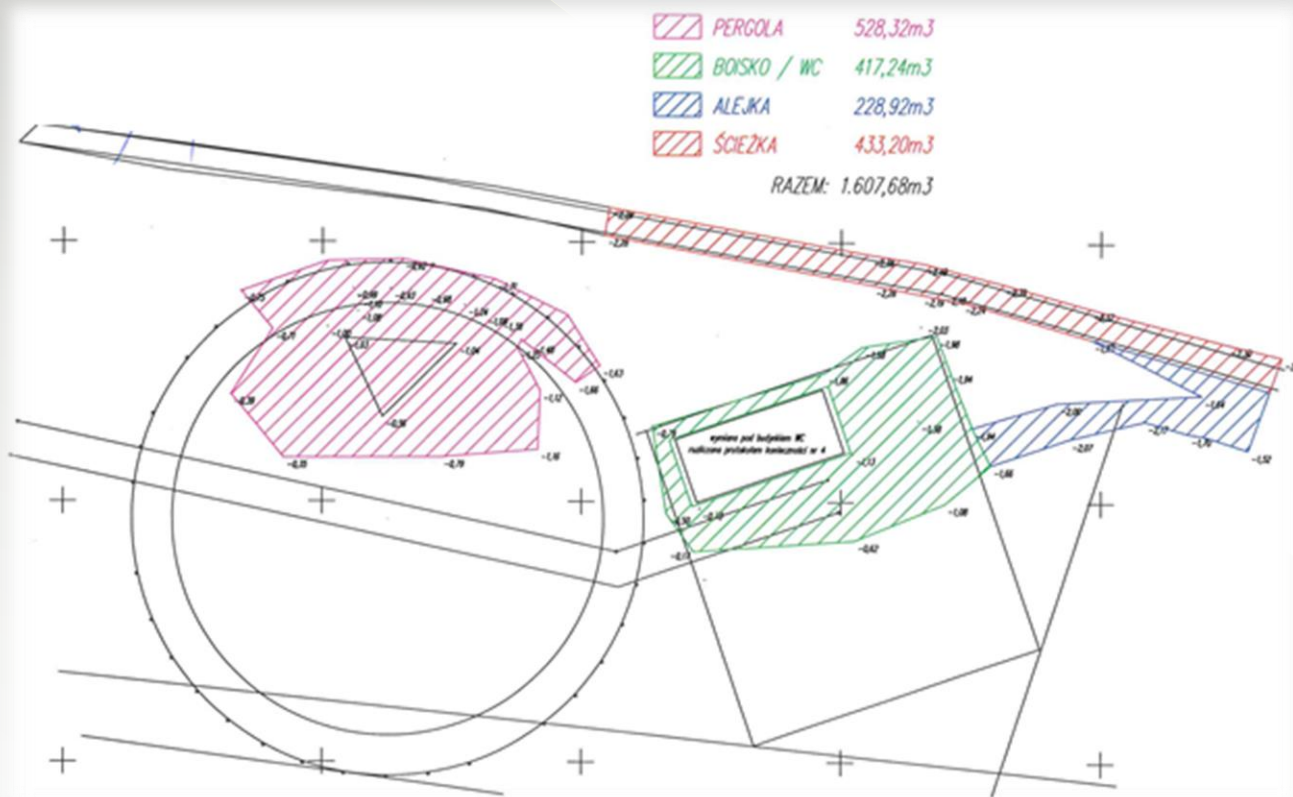

Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokół” w Pniewach

Problemy napotkane na etapie realizacji

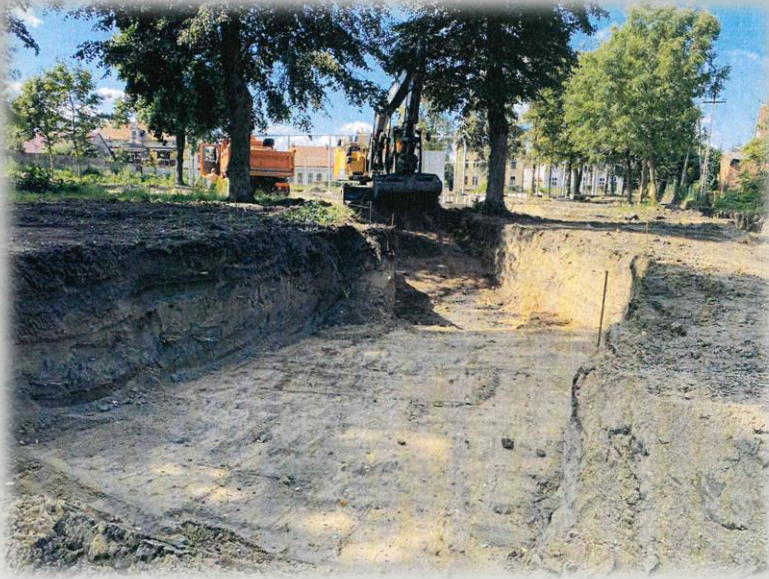

Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokoła” w Pniewach

Problemy napotkane na etapie realizacji

Ponadto przewidywane są koszty dodatkowe związane z:

1. Zwiększeniem grubości nawierzchni poliuretanowej na placu Street Workout, ze względu na konieczność spełnienia wymogów dot. krytycznej wysokości upadkowej – **38 631,81 zł**,
2. Montażem lin stalowych na konstrukcji pergoli,
3. Rozliczeniem powykonawczym wykorzystania stali do budowy pergoli – nastąpiła konieczność zmiany lokalizacji słupów w celu uniknięcia kolizji z bryłą korzeniową drzew,
4. Montażem oświetlenia przy ścieżce rowerowej.



Połączenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Pniewach

Zakres zadania obejmował wykonanie połączenia sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 187 (ul. Dworcowa w Pniewach) z kanalizacją deszczową na terenie Boiska Sokół.

- > Termin odbioru: **7 października 2021 r.**
- > Wykonawca: **Usługi Instalacji Sanitarnych i Grzewczych Paweł Musiał, ul. Promienista 22, 62-045 Pniewy**
- > Wartość umowy: **30 750,00 zł**



Przebudowa nawierzchni ul. Tulipanowej w Pniewach na drogę śladową

⦿ Zakres zadania

Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni na długości ok. 480 m na drogę śladową wraz z ułożeniem nawierzchni zjazdów publicznych z kostki betonowej.

> Termin realizacji: **do 26 października 2021 r.**

> Wykonawca: **GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Strzelecka 18 G,
62-045 Pniewy**

> Wartość umowy: **291 358,71 zł**

> Etap realizacji: **trwają roboty budowlane**



Przebudowa ulicy Jasnej, pomiędzy ulicami Spokojną i Promienistą, w Pniewach

⦿ Zakres zadania

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wjazdów, dojazdów do furtek i miejsc parkingowych z kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

> Termin odbioru: **27 września 2021 r.**

> Wykonawca: **BRUKBED Radosław Kuczyński, ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy**

> Wartość umowy: **352 662,91 zł**

PRZED



PO



⦿ **Zakres zadania**

Zadanie obejmowało ułożenie nowej nawierzchni z płyt drogowych betonowych o szerokości 300 cm na ul. Borówkowej (194 mb) i ul. Malinowej (219,7 mb) w Pniewach.

>Data odbioru zadania: **9 września 2021 r.**

>Wykonawca: **GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Strzelecka 18 G, 62-045 Pniewy**

>Wartość umowy: **299 837,32 zł**



Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach
-ZADANIE ZREALIZOWANE

ULICA BORÓWKOWA

PRZED



PO



Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach
-ZADANIE ZREALIZOWANE

ULICA MALINOWA

PRZED



PO



Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Lwóweckiej w Pniewach -ZADANIE ZREALIZOWANE

⦿ Zakres zadania

Zadanie obejmowało ułożenie 50 mb nowej nawierzchni z płyt drogowych betonowych o szerokości 300 cm w rejonie ul. Lwóweckiej w Pniewach, w tym 37 mb zostało ułożonych z płyt drogowych zdemontowanych z ul. Jasnej w Pniewach.

>Data odbioru zadania: **31 sierpnia 2021 r.**

>Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Musiał, ul. Słowiańska 34, 62-045 Pniewy**

>Wartość umowy: **25 318,94 zł**

PRZED




PO



Podsumowanie zadań realizowanych w 2021 r. przez Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Lp.	Zadanie	Dofinansowanie	Wkład własny	Całość
1	Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I	10 695 626,40 zł	5 204 450,37 zł	15 900 076,77 zł
2	Wdrażanie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej (zakres wykonany w 2021 r.)	655 282,64 zł	994 717,36 zł	1 650 000,00 zł
3	Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła"	3 718 841,00 zł	806 405,17 zł	4 525 246,17 zł
4	Połączenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Pniewach	- zł	30 750,00 zł	30 750,00 zł
5	Przebudowa nawierzchni ul. Tulipanowej na drogę śladową	- zł	291 358,71 zł	291 358,71 zł
6	Przebudowa ul. Jasnej, pomiędzy ulicami Spokojna i Promienistą, w Pniewach	- zł	352 662,91 zł	352 662,91 zł
7	Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach.	- zł	299 837,32 zł	299 837,32 zł
8	Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Lwóweckiej w Pniewach	- zł	25 318,94 zł	25 318,94 zł
9	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków pałacu, sali gimnastycznej oraz bursy w Pniewach	- zł	87 893,22 zł	87 893,22 zł
SUMA		15 069 750,04 zł	8 093 394,00 zł	23 163 144,04 zł

Podsumowanie zadań realizowanych w 2021 r. przez Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

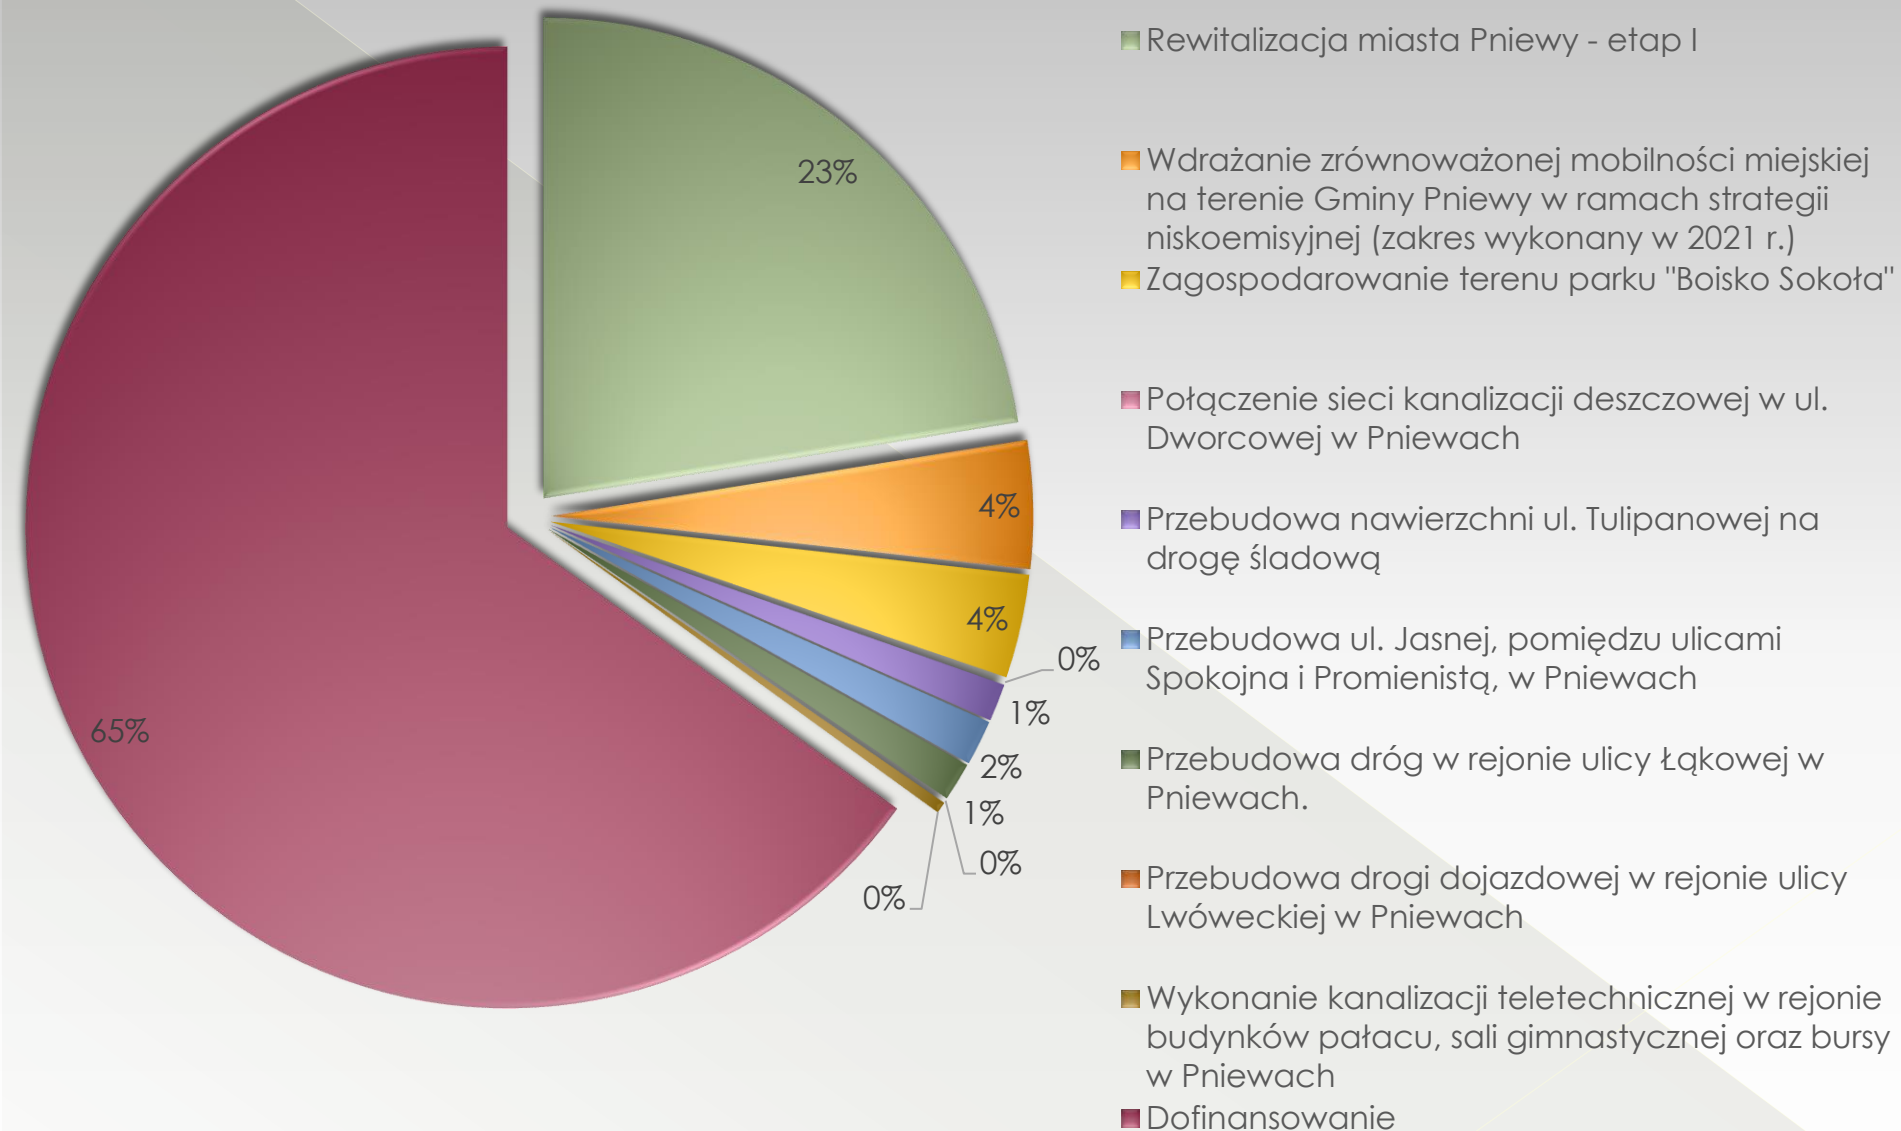


Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - zadanie zakończone w 2020 r.

- Zakres zadania obejmował termomodernizację 6 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy:
 1. Liceum Ogólnokształcące w Pniewach
 2. Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach
 3. Szkoła Podstawowa w Pniewach
 4. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pniewach
 5. Szkoła Podstawowa w Chełmnie
 6. Szkoła Podstawowa w Nojewie
- **Całkowity koszt realizacji zadania (koszty poniesione w latach 2015-2020):**
11 184 933,67 zł
- **Wysokość dofinansowania:**
6 911 203,91 zł
- I rata refundacji wpłynęła 30 grudnia 2020 r. w wysokości 4 926 627,04 zł.
- Pozostała część refundacji, wysokości 1 984 576,87 zł, zostanie wypłacona po ostatecznym zaakceptowaniu końcowego wniosku o płatność.



Podsumowanie zadania pn. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Lp.	Zadanie	Dofinansowanie	Wkład własny	Całość
1	Liceum Ogólnokształcące	1 359 048,13zł	468 069,42 zł	1 811 345,44zł
2	Sala gimnastyczna przy LO w Pniewach	816 856,27 zł	207 488,09 zł	1 096 707,56zł
3	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2 372 473,09 zł	1 502 419,22 zł	4 292 876,23 zł
4	Sala gimnastyczna przy SP w Pniewach	1 136 812,85 zł	305 349,19 zł	1 477 293,45 zł
5	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	736 167,64 zł	552 023,38 zł	1 325 056,87 zł
6	Szkoła Podstawowa w Nojewie	489 845,93 zł	216 122,52 zł	778 071,23 zł
7	Koszty pozostałe*	- zł	404 582,89zł	404 582,89 zł
SUMA		6 911 203,91 zł	4 273 729,76 zł	11 184 933,67 zł

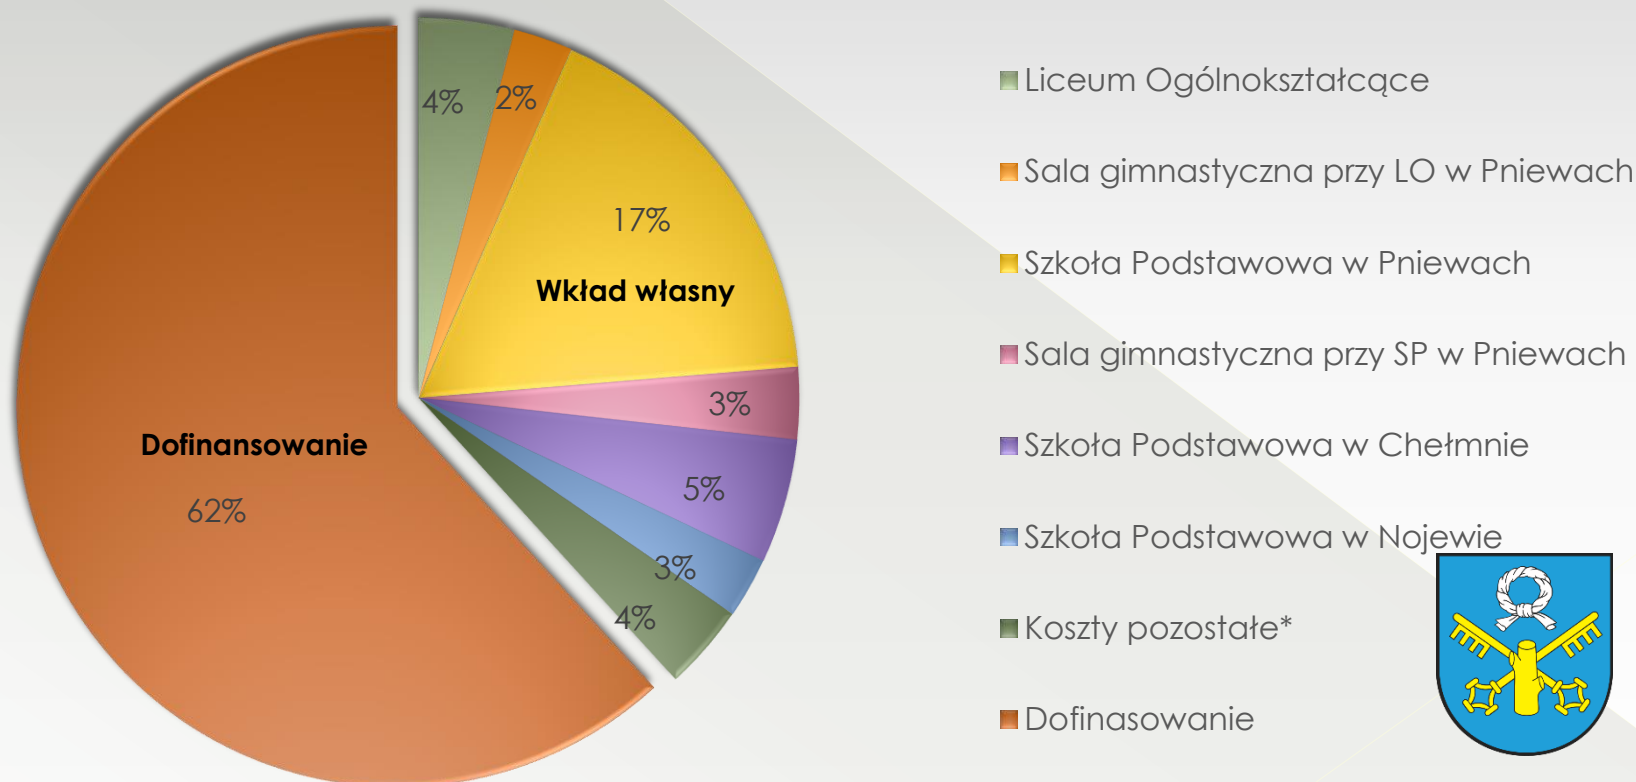

* Koszty pozostałe - opracowanie dokumentacji, ekspertyzy, nadzór autorski, koszty bieżące

Zadania projektowe



Zagospodarowanie kąpieliska w Zamorzu

Zakres zadania obejmuje:

- > utwardzenie nawierzchni strefy wejściowej,
- > montaż zabawek / urządzeń sprawnościowych
- > montaż elementów małej architektury – ławki, kubły na śmieci, tablica informacyjna

>Szacunkowy koszt realizacji: **97 127,80 zł**


>Etap realizacji: **został złożony wniosek o dofinansowanie do KOLD-u**



Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie

Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie budowę altany na utwardzeniu z kostki betonowej, montaż urządzeń zabawowych, montaż elementów małej architektury oraz budowę budynku gospodarczego i ogrodzenia.


- > Szacunkowy koszt realizacji: **283 837,15 zł**
- > Etap realizacji: **trwa procedura przejęcia działki od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa**

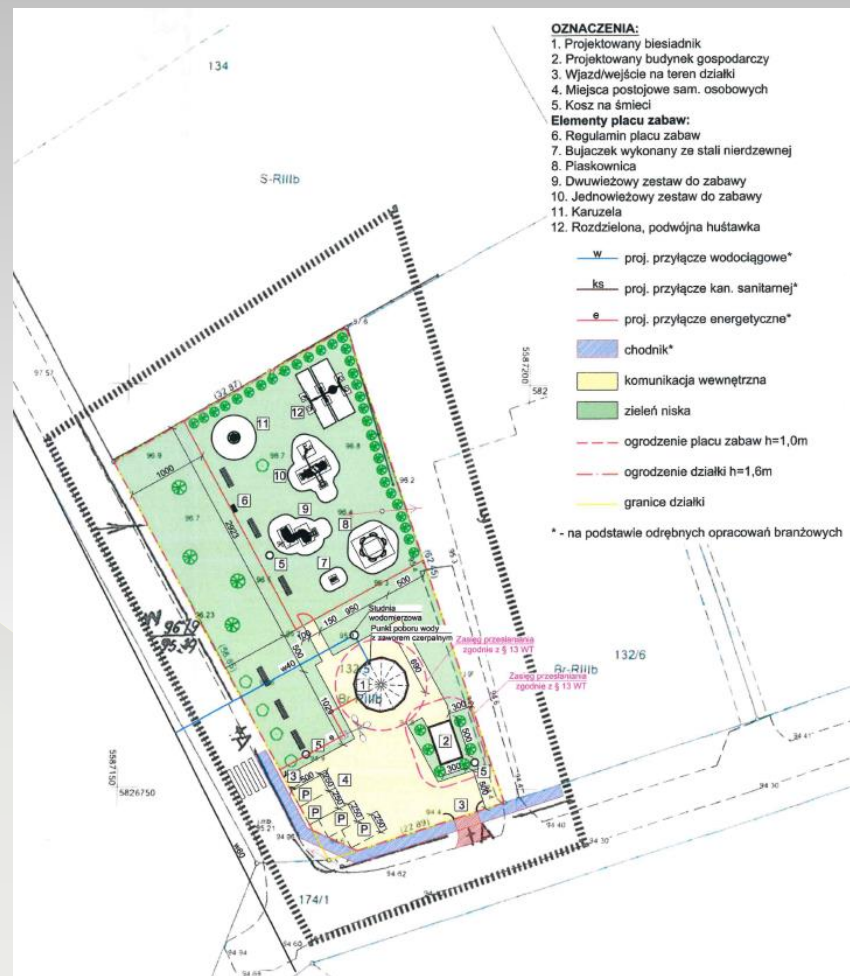

Przebudowa ulicy Tęczowej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną, w Pniewach

Dokumentacja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wjazdów, dojazdów do furtek i miejsc parkingowych z kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.


›Szacunkowy koszt realizacji: **596 629,93 zł**

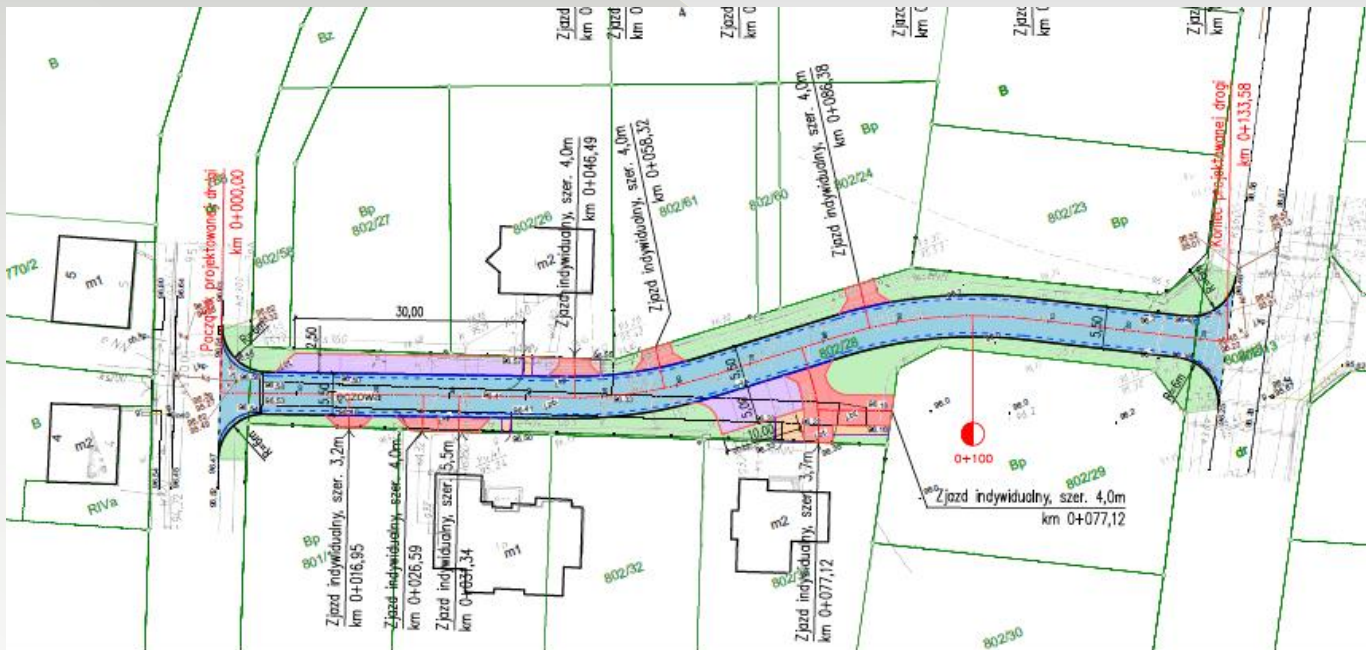

Budowa ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach pomiędzy ul. Słonecznikową i ul. Hiacyntową

Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę drogi poprzez wykonanie ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach pomiędzy ulicą Słonecznikową i ul. Hiacyntową z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej infrastruktury.

➤ Szacunkowy koszt realizacji: **354 870,12 zł**

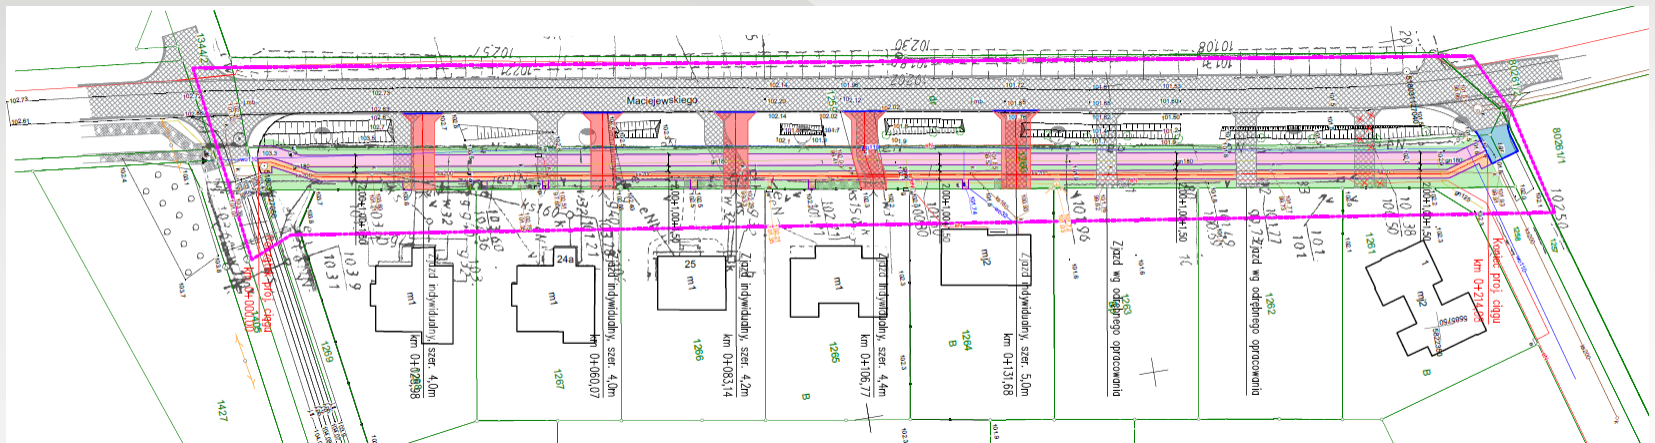


Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach

Dokumentacja obejmuje ułożenie nowych utwardzeń w pasie drogi, wydzielenie zatoki parkingowej, montaż oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanału technologicznego.

Ponadto zostanie zadanie przewiduje przebudowę sieci energetycznej oraz modernizację sieci kanalizacji deszczowej.

>Szacunkowy koszt realizacji:

624 083,46 zł

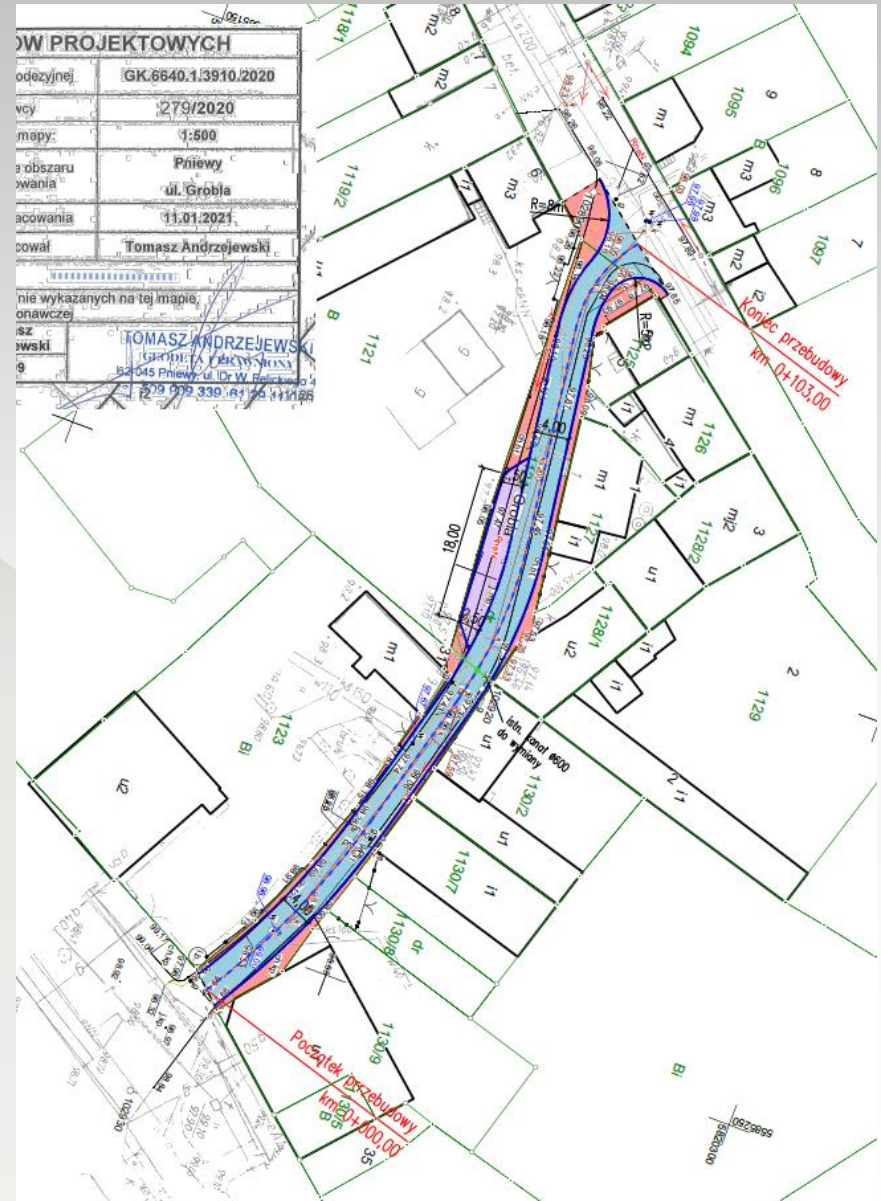

Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Pniewach

Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę drogi wraz z przebudową oświetlenia ulicznego oraz odwodnieniem.

Ponadto w ramach zadania zostanie uwzględniona przebudowa napowietrznej sieci energetycznej oraz budowę kanału technologicznego.

>Szacunkowy koszt realizacji zadania:


1 113 686,72 zł



Budowa parkingu przy ul. Jeziornej w Pniewach

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w zakresie obejmującym budowę parkingu przy ul. Jeziornej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.

- > Termin realizacji: **do 27 grudnia 2021 r.**
- > Etap realizacji: **złożony wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (zmniejszenie dopuszczalnej odległości wydzielonych miejsc postojowych od granicy działki budowlanej i od okien budynków mieszkalnych)**

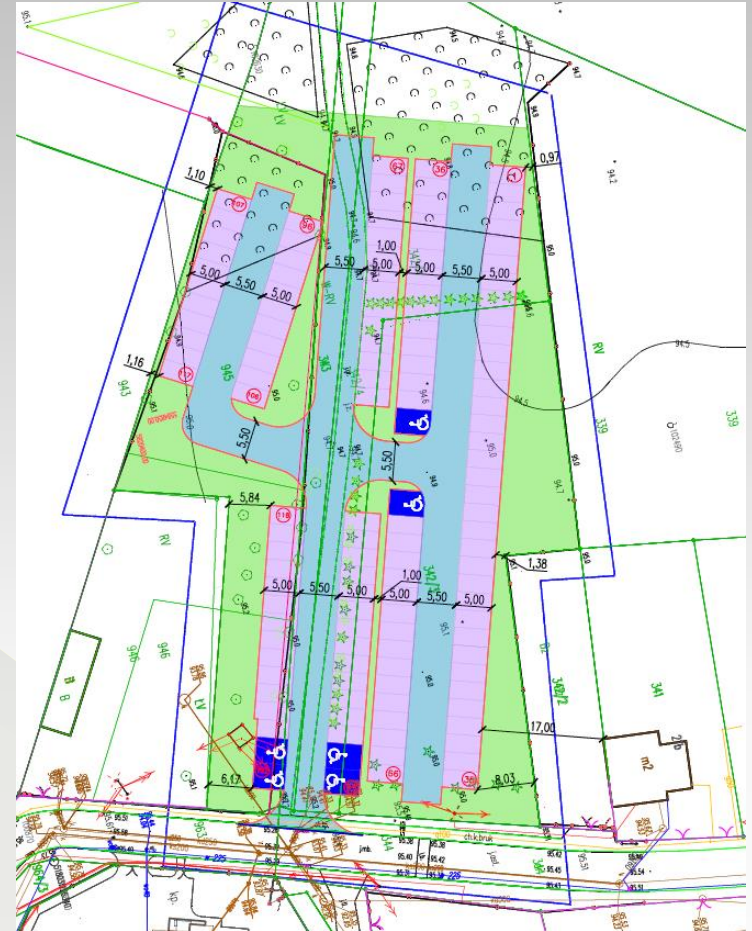

Modernizacja pomieszczeń budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w zakresie obejmującym remont pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej.

>Termin realizacji: **do 15 grudnia 2021 r.**

>Etap realizacji: **uzyskano pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę**



Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w zakresie renowacji budynku "starej poczty i hotelu" w Pniewach z przeznaczeniem budynku na hotel. Dokumentacja będzie przewidywała doprowadzenie budynku do stanu deweloperskiego.

>Termin realizacji:

do 12 listopada 2021 r.

>Etap realizacji:

uzgodnienia koncepcji

z Inwestorem – Gminą Pniewy



Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole



Zakres dokumentacji projektowej przewiduje przebudowę z rozbudową oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej Centrum Kultury Pniewy na cele przedszkola.

Zaprojektowano 6 oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych na dwóch kondygnacjach nadziemnych z pomieszczeniami pomocniczymi oraz zapleczem kuchennym.

Ponadto zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw oraz budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

➤Szacunkowy koszt realizacji zadania: **2 520 789,75 zł**

➤Etap realizacji: **złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę**

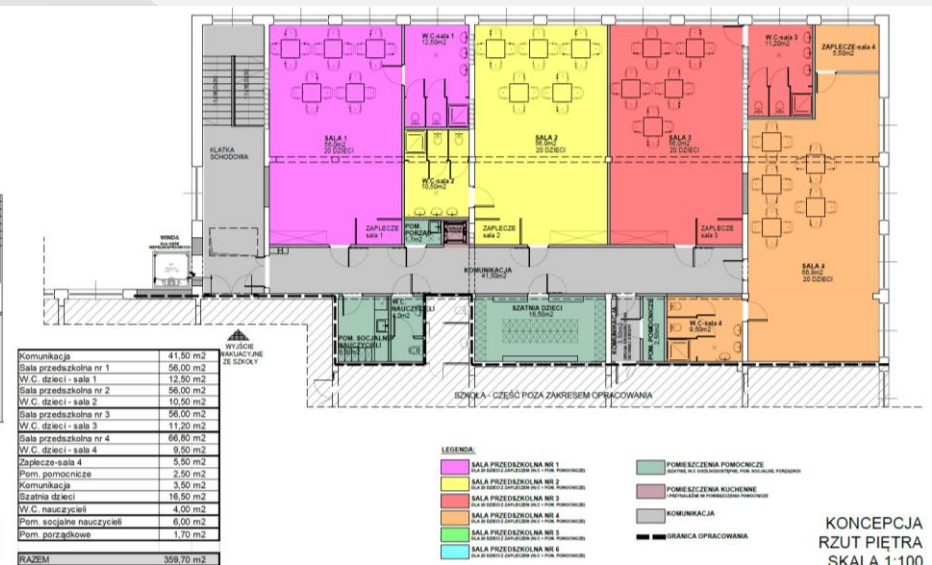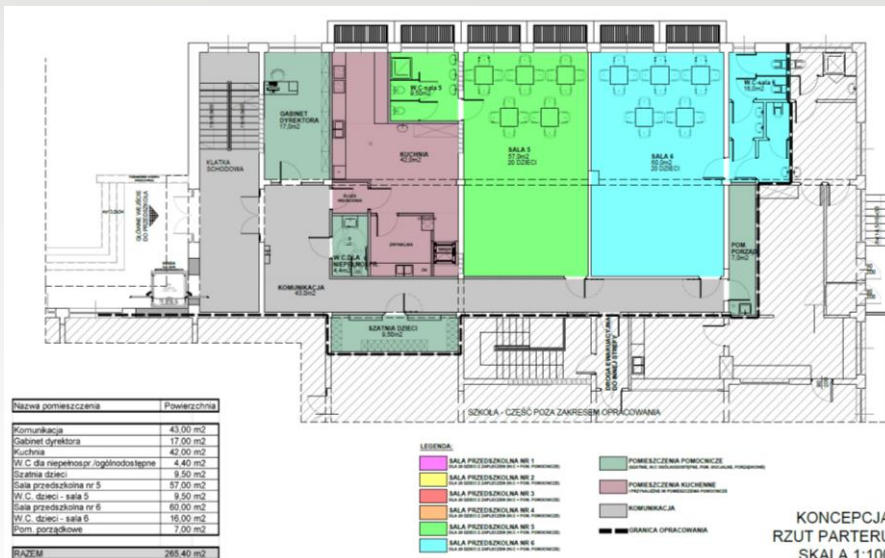

Rewitalizacja parku miejskiego w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów

Trwa opracowanie projektu zagospodarowania parku w zakresie: układu komunikacyjnego, elementów wyposażenia (placu zabaw, małej architektury, pomostów), zieleni oraz strefy dla psów.

- > Termin realizacji: **do 15 grudnia 2021 r.**
- > Etap realizacji: **uzgodnienia koncepcji z Inwestorem – Gminą Pniewy**



Przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej obejmującej przebudowę drogi wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wykonaniem kanału technologicznego.


- Termin realizacji: **do 30 listopada 2021 r.**
- Etap realizacji: **uzgodniono z mieszkańcami koncepcję.**



Podsumowanie zadań projektowych

Lp.	Zadanie	Koszt wykonania dokumentacji
1	Zagospodarowanie kąpieliska w Zamorzu	4 000,00 zł
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie	6 765,00 zł
3	Przebudowa ulicy Teczowej, pomiędzy ilicami Prominista i Spokojną w Pniewach	28 290,00 zł
4	Budowa ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach pomiędzy ul. Słonecznikową i ul. Hiacyntową	40 000,00 zł
5	Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach	54 120,00 zł
6	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Pniewach	70 000,00 zł
7	Budowa parkingu przy ul. Jeziornej w Pniewach	70 000,00 zł
8	Modernizacja pomieszczeń budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach	135 000,00 zł
9	Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I	116 850,00 zł
10	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek	94 666,95 zł
11	Rewitalizacja parku miejskiego w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów	49 200,00 zł
12	Remont ogrodzenia terenu przy LO w Pniewach od strony ul. Św. Ducha	3 690,00 zł
13	Przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach	67 650,00 zł
SUMA		740 231,95 zł

Podsumowanie zadań projektowych



- Zagospodarowanie kąpieliska w Zamorzu
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie
- Przebudowa ulicy Teczowej, pomiędzy ilicami Prominista i Spokojną w Pniewach
- Budowa ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach pomiędzy ul. Słonecznikową i ul. Hiacyntową
- Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach
- Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Pniewach
- Budowa parkingu przy ul. Jeziornej w Pniewach
- Modernizacja pomieszczeń budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach
- Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek
- Rewitalizacja parku miejskiego w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów
- Remont ogrodzenia terenu przy LO w Pniewach od strony ul. Św. Ducha
- Przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska



Profilowanie, wałowanie i utwardzenie nawierzchni dróg gminnych

⦿ Zakres prac z podziałem na zadania:

- przewidywana ilość metrów do utwardzenia gruzem wykonawcy to 11 120 m²
- przewidywana ilość metrów do utwardzenia tłuczniem wykonawcy to 4 960 m²
- przewidywana ilość metrów do profilowania i wałowania to 290 057,67 m²

> Termin realizacji: **do 17 grudnia 2021 r.**

> Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe**

Krzysztof Nadobnik, Kościan

> Wartość robót: **315 246,90 zł**



Zajaczkowo



Zajaczkowo



Zamorze



Zamorze



ZAMORZE



Jakubowo



Nojewo



Buszewko



ul. Żonkilowa



EDUKACJA EKOLOGICZNA

- Edukacja ekologiczna jest jednym z zadań gminy w ramach realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Zakup foto pułapek w ilości 2 sztuk wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Celem jest likwidacja i zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk odpadów.
Kwota zakupu wynosiła: 5 251,98 zł.



EDUKACJA EKOLOGICZNA

> Pniewski Punkt Elektroodpadów

PPE stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim jest edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów niebezpiecznych. Urządzenie łączy w sobie kilka funkcji.

Funkcja informacyjna – sygnalizuje problem elektroodpadów, potrzeby ich osobnej segregacji

Funkcja gromadzenia posortowanych elektroodpadów – 7 tub o pojemności 33 litry każda są pojemnikami, do których można wrzucać takie odpady jak: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty cd, tonery. Na chwilę obecną dokonano zakupu 3 takich urządzeń, które znajdują się następujących lokalizacjach

- Zintegrowane Centrum Przesiadkowe (dawny dworzec PKS)
- Rejon skrzyżowania ul. Poznańskiej i Wolności
- Teren przy Szkole Podstawowej w Pniewach

W realizacji jest zakup kolejnych 2 Pniewskich Punktów Elektroodpadów (przy SP Nojewo i SP Chełmno)



Wartość inwestycji : 64 538,10 zł




EDUKACJA EKOLOGICZNA

> **Metalowe Serca do zbiórki plastikowych nakrętek**

To także ważny element edukacji ekologicznej. Poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek, które segregujemy można również pomagać osobom potrzebującym.

Na chwilę obecną dokonano zakupu 6 takich serc, które znajdują się następujących lokalizacjach :

- Zintegrowane Centrum Przesiadkowe (dawny dworzec PKS)
- Teren przy Szkole Podstawowej w Pniewach.
- Turowo
- Dębina
- Nojewo
- Chelmino

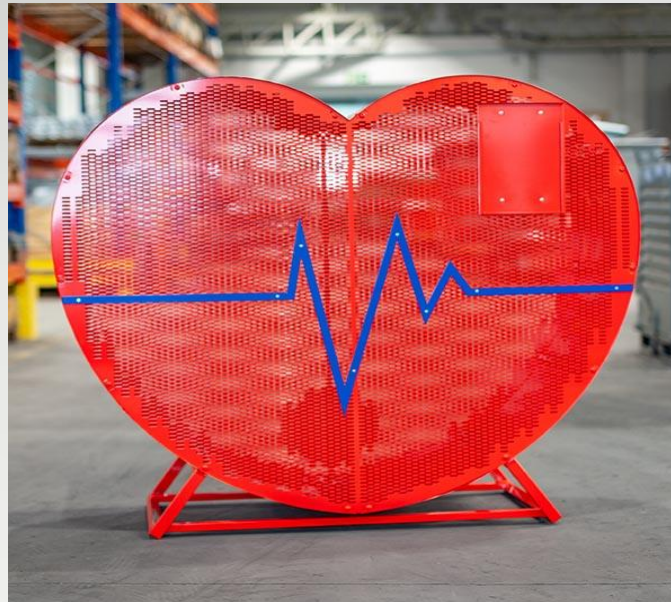

Wartość zakupu: 4391,10 zł



Referat Gospodarki Nieruchomościami



„Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Wronieckiej 14a w Pniewach” zadanie realizowane

⦿ **Zakres zadania**

Remont lokalu obejmuje:

- a. przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe (rozbiórka ściany działowej wydzielającej pomieszczenie gospodarczego, łazienkę),
- b. wymiana fragmentu nieszczelnej instalacji gazowej,
- c. zmiana układu funkcjonalnego mieszkania – zmiana lokalizacji łazienki, wydzielenie przedpokoju, zmiana lokalizacji wejścia do mieszkania)
- d. wykonanie instalacji c.w.u., z.w.u. i kanalizacji,
- e. wymiana zużytej technicznie instalacji elektrycznej w łazience, kuchni, przedpokoju,
- f. wykonanie prac ogólnobudowlanych – likwidacja zagrzybienia na ścianach, wykonanie ścian działowych, wymiana drzwi wejściowych do lokalu oraz drzwi wewnątrz lokalu, wykonanie wentylacji łazienki oraz kuchni, wykonanie łazienki.

⦿ **Wykonawca**

- Zakład Usługowo-Wielobranżowy Piotr Cegliński,
ul. Kraszewskiego 22, 62-045 Pniewy.

⦿ **Termin wykonania**

22.03.2021 – 12.07.2021 r.

⦿ **Koszt zadania**

- Koszt całkowity – 37 040,53 zł



Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku
przy ul. Wronieckiej 14a w Pniewach”
zadanie realizowane



Malowanie, tapetowanie, lampy
oświetleniowe po stronie najemcy.





„Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Poznańskiej 9 w Pniewach” zadanie realizowane

⦿ **Zakres zadania**

Remont lokalu obejmuje m.in.:

- prace przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe (rozbiórka ściany działowej wydzielającej pomieszczenie gospodarczego, łazienkę),
- wymiana fragmentu nieszczelnej instalacji gazowej,
- wymiana zużytej technicznie instalacji elektrycznej,
- zmiana układu funkcjonalnego mieszkania – zmiana lokalizacji łazienki, zmiana lokalizacji wejścia do mieszkania), łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową
- wykonanie instalacji c.w.u., z.w.u. i kanalizacji,
- wykonanie prac ogólnobudowlanych – likwidacja zagrzybienia na ścianach, wykonanie ścian działowych, wymiana drzwi wejściowych do lokalu oraz drzwi wewnątrz lokalu, wykonanie wentylacji łazienki oraz kuchni.

⦿ **Wykonawca**

- Zakład Usługowo-Wielobranżowy Piotr Cegliński,
ul. Kraszewskiego 22, 62-045 Pniewy.

⦿ **Termin wykonania**

22.03.2021 – 4.10.2021 r. (prace wstrzymane na 92 dni)


⦿ **Koszt zadania**

- Koszt całkowity – 57 102,73zł





„Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Poznańskiej 9 w Pniewach”
zadanie realizowane

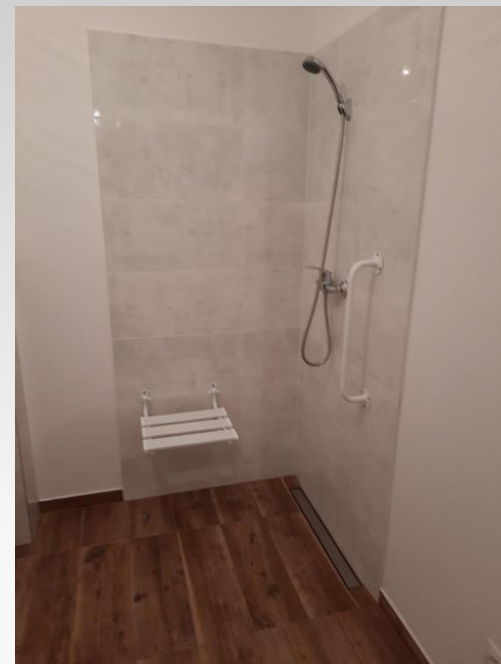



„Kaplica cmentarna – remont ściany frontowej” zadanie zrealizowane

⦿ **Zakres zadania**

- Zdemontować istniejącą ścianę szklano-metalową,
- Wykonać podciąg żelbetowy, na nim ścianę z bloczków gazobetonowych,
- Zamontować ścianę lekką szklano-aluminiową,
- Uzupelnąć tynki, odmalować fragmenty ściany,
- Ułożyć kostkę w strefie wejścia,
- Zamontować oświetlenie.

⦿ **Wykonawca**

- Zakład Usługowo-Wielobranżowy Piotr Cegliński,
ul. Kraszewskiego 22, 62-045 Pniewy.

⦿ **Termin wykonania**

5.05.2021 – 30.09.2021 r.

⦿ **Koszt zadania**

- Koszt całkowity – 104 690,66 zł



„Kaplica cmentarna – remont ściany frontowej”
zadanie zrealizowane



„Cmentarz komunalny – nasadzenia roślinności” zadanie zrealizowane

⦿ **Zakres zadania**

- Przygotowanie terenu pod nasadzenia, sadzenie drzew i krzewów,
- Posadzono drzewka głogu (20 szt.) i buku (2 szt.), oraz krzewy - berberysy, kosodrzewinę, irgę i bluszcz zwyczajny.

⦿ **Wykonawca**

- Spółdzielnia Socjalna „Horyzont”,
ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy.


⦿ **Termin wykonania**

15.04.2021 – 21.04.2021 r.

06.05.2021 – 12.05.2021 r.

⦿ **Koszt zadania**

- Koszt wykonania nasadzeń – 3 260,00 zł
- Koszt roślin – 5 700,00 zł

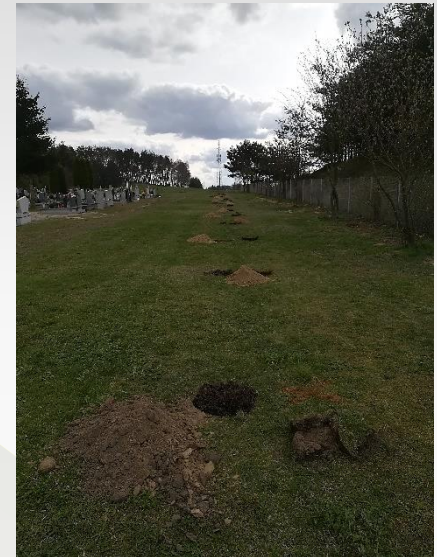

„Cmentarz komunalny – nasadzenia roślinności” zadanie zrealizowane



„Cmentarz komunalny – kompostownik” zadanie zrealizowane

- ◉ **Zakres zadania**
 - Przygotowanie na terenie cmentarza kompostownika.
- ◉ **Wykonawca**
 - Urząd Miejski Pniewy,
ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.
- ◉ **Termin wykonania**

15.04.2021 – 30.04.2021 r.
- ◉ **Koszt zadania**
 - Koszt zakupu materiału – 1 472,00 zł



„Cmentarz komunalny – rozbudowa monitoringu” zadanie zrealizowane

⦿ Zakres zadania

- Zakup 4 kamer wraz z niezbędnym osprzętem do monitoringu terenu cmentarza komunalnego.

⦿ Wykonawca


- Firma Usługowa MARCOL
Marek Małłoka,
ul. Świerkowa 14, 61-472 Poznań.

⦿ Termin wykonania



20.09.2021 – 24.09.2021 r.

⦿ Koszt zadania

- Koszt zakupu – 7 500,00 zł

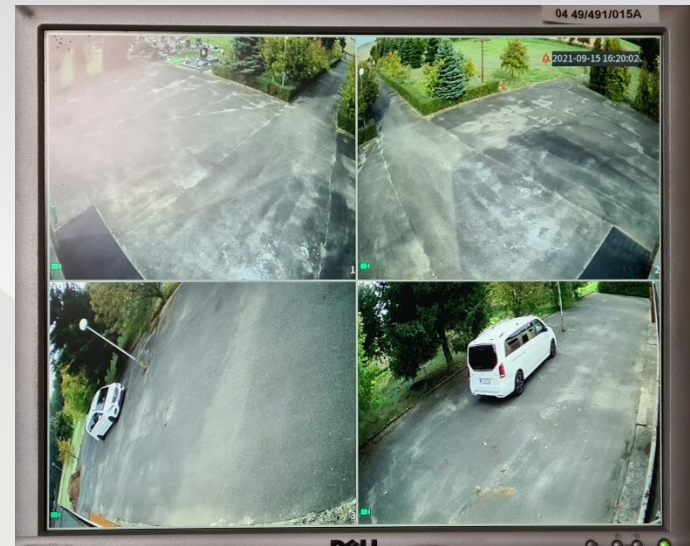

„Cmentarz komunalny – rozbudowa monitoringu”
zadanie zrealizowane

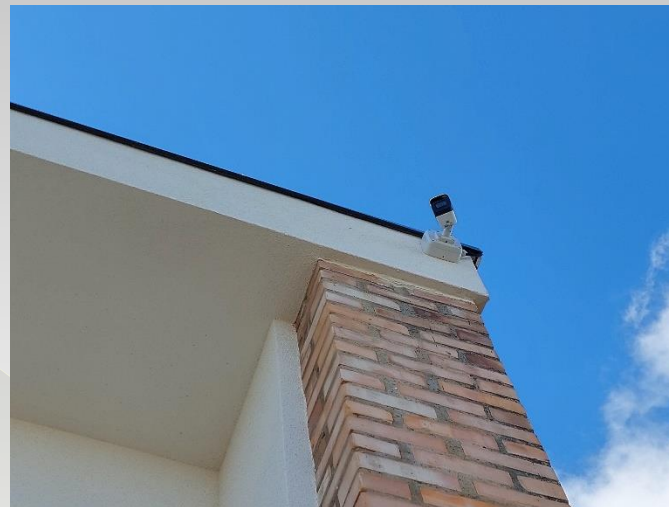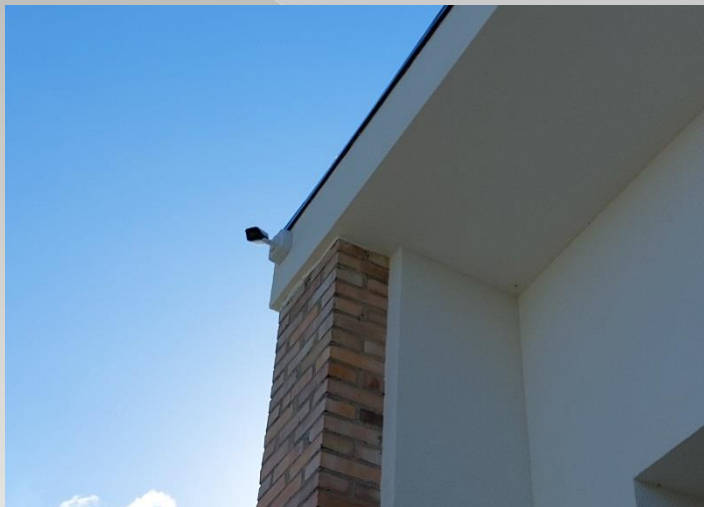

„Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Orliczku” zadanie zrealizowane

⦿ **Zakres zadania**

- Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Orliczku. W ramach zadania wykonano również bramę techniczną oraz furtkę. Łączna długość ogrodzenia ok. 72 mb.

⦿ **Wykonawca**

- Zakład Usługowo-Wielobranżowy Piotr Cegliński,
ul. Kraszewskiego 22, 62-045 Pniewy.
- Firma Usługowo-Handlowa Jacek Kaczmarek
Punkt Sprzedaży – Pniewy
ul. Wroniecka 17A, 62-045 Pniewy

⦿ **Termin wykonania**


17.08.2021 – 30.09.2021 r.

⦿ **Koszt zadania**

- Koszt całkowity – 20 180,01 zł
(materiał – 8 549,25 zł, montaż 11 630,76 zł)



„Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Orliczku”
zadanie zrealizowane

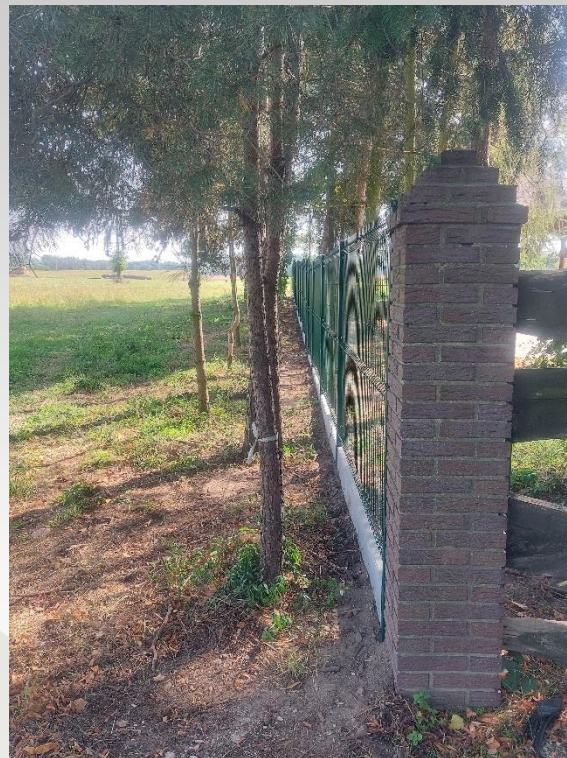

„Ogrodzenie wzdłuż ulicy przy świetlicy wiejskiej w Orliczku” zadanie realizowane

⦿ **Zakres zadania**

- Wymiana ogrodzenia z drewnianych elementów wzdłuż ulicy przy świetlicy wiejskiej w Orliczku. W ramach zadania wymienione zostanie ogrodzenie na odcinku ok. 26 m.

⦿ **Wykonawca**

- Zakład Usługowo-Wielobranżowy Piotr Cegliński,
ul. Kraszewskiego 22, 62-045 Pniewy.

⦿ **Termin wykonania**


6.09.2021 – 29.10.2021 r.

⦿ **Koszt zadania**

- Koszt całkowity – 16 677,45 zł



„Ogrodzenie wzdłuż ulicy przy świetlicy wiejskiej w Orliczku”
zadanie realizowane

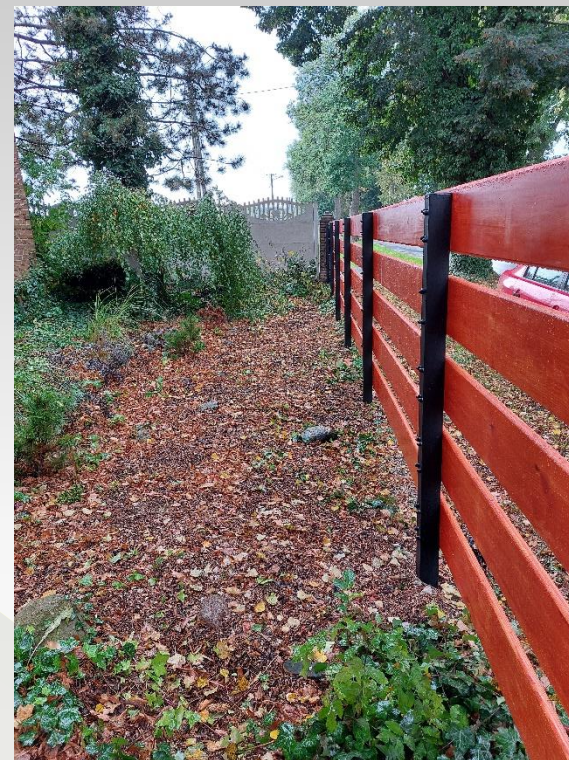

„Przebudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Dębinie” zadanie realizowane

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- ⦿ **Zakres zadania**
 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca remont wraz z przebudową pomieszczeń zaplecza świetlicy wiejskiej w Dębinie.
- ⦿ **Wykonawca**
 - Zakład Projektowych i Inwestycyjnych Maria i Waldemar Pięta,
ul. Targowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl.
- ⦿ **Termin wykonania**


8.09.2021 – 30.09.2021 r.
- ⦿ **Koszt zadania**
 - Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 7 872,00 zł




„Przebudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Dębiniu” zadanie realizowane

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Stan istniejący

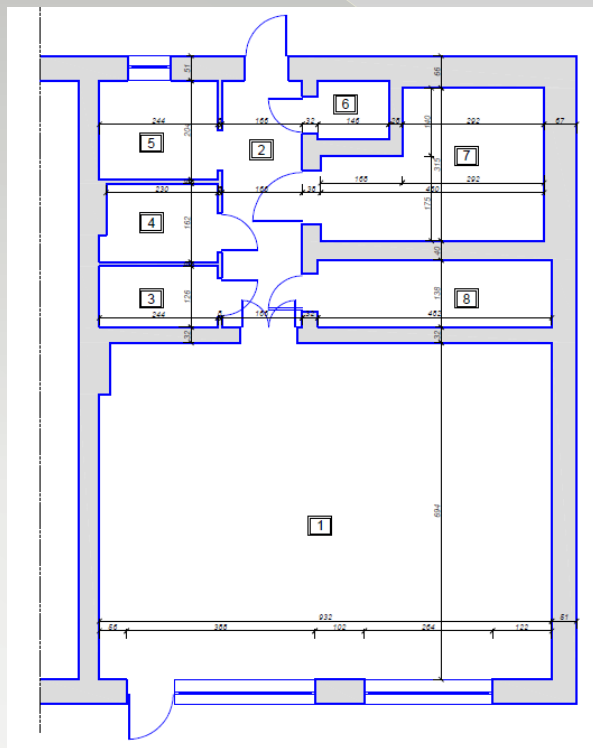

Stan projektowany

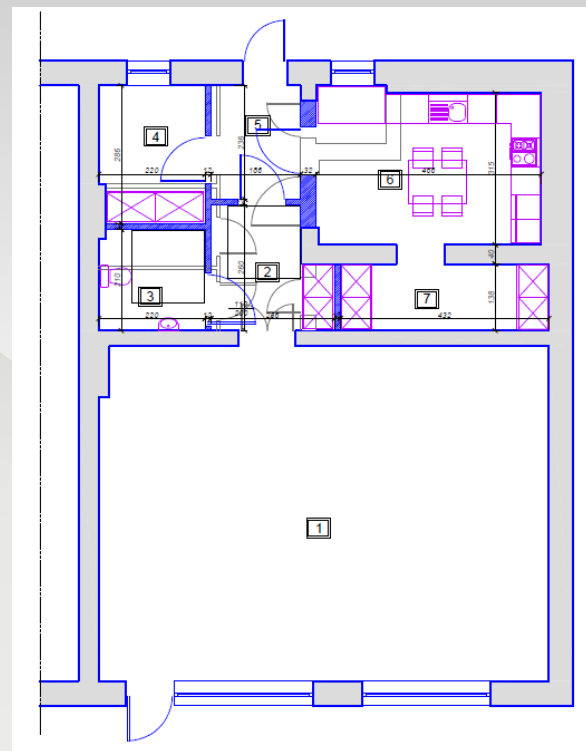

Koszt inwestycji wg kosztorysu:

141 494,88 zł

Powierzchnia użytkowa:

106,26 m²



„Przebudowa istniejącej toalety publicznej wraz z budową nowej automatycznej toalety publicznej w Pniewach przy ul. Jeziornej”
zadanie realizowane

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

⦿ **Zakres zadania**

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca zmianę funkcji istniejącej toalety publicznej na pomieszczenia gospodarcze oraz projekt automatycznej toalety publicznej w Pniewach przy ul. Jeziornej.

⦿ **Wykonawca**

- Pracownia Projektowa IGNASIAK
Konrad Ignasiak,
ul. Rynek 6/8, 64-500 Szamotuły.

⦿ **Termin wykonania**

29.06.2021 – 27.09.2021 r.


⦿ **Koszt zadania**

- Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej– 14 000,00 zł



„Przebudowa istniejącej toalety publicznej wraz z budową nowej automatycznej toalety publicznej w Pniewach przy ul. Jeziornej” zadanie realizowane

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

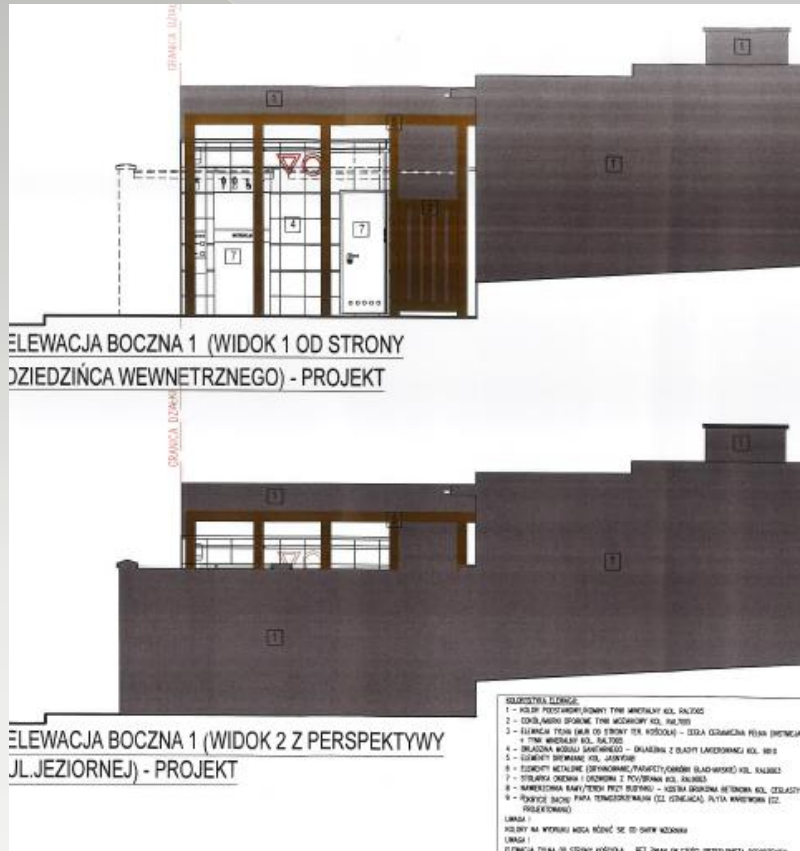

Koszt inwestycji wg kosztorysu:
Powierzchnia użytkowa:
(w tym toaleta automatyczna:

439 794,20 zł
62,14 m²
6,42 m²)



Inwestycje placówek oświatowych



Remont w budynku C Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach

⦿ Zakres zadań

Zadania remontowe obejmowały prace ogólnobudowlane w sali lekcyjnej 203C, na korytarzu na I piętrze wraz z przyklejaniem do ścian cokołów i listew ochronnych z PCV.

- > Termin realizacji: **kwiecień i sierpień 2021 r.**
- > Wykonawca: **Antosz Sp. z o.o., Pniewy**
- > Wartość robót: **81 608,20 zł**



Remont w budynku C Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach


⦿ Zakres zadań

Dodatkowo wymieniono drzwi wejściowe do sal lekcyjnych i łazienek:

- > Wykonawca: **P.W. TDR Marcin Jęsiak, Pniewy**
- > Wartość robót: **29 287,33 zł**

Dodatkowo w Sali 203C uruchomiono sieć IT

- > Wykonawca: **Advisor Sp. z o.o. Sp. K., Poznań**
- > Wartość robót: **14 440,00 zł**

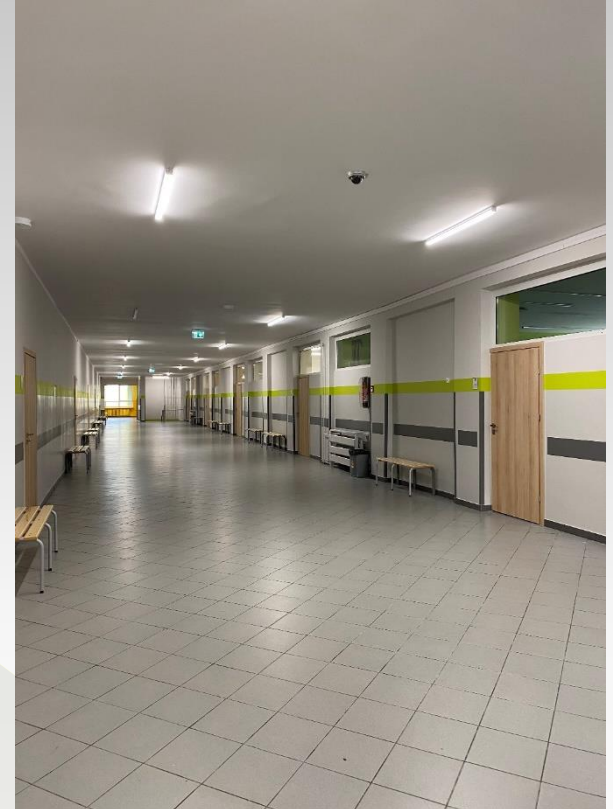


Pozostałe remonty w budynkach Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach

○ Zakres zadań

Zadania obejmowały usunięcie usterki po wymianie rur centralnego ogrzewania, remont klatek schodowych w budynku oraz poprawa obwodów oświetlenia zewnętrznego i wymiana instalacji elektrycznej.

- › Termin realizacji: **marzec i kwiecień 2021 r.**
- › Wykonawca: **Instalacje elektryczne Sylwester Kryczko, Pniewy**
- › Wartość robót: **24 030,90 zł**
- › Etap realizacji: **zadanie zakończone**

- › Termin realizacji: **sierpień 2021 r.**
- › Wykonawca: **Usługi Ogólnobudowlane Paweł Antosz, Pniewy**
- › Wartość robót: **53 807,89 zł**
- › Etap realizacji: **zadanie zakończone**

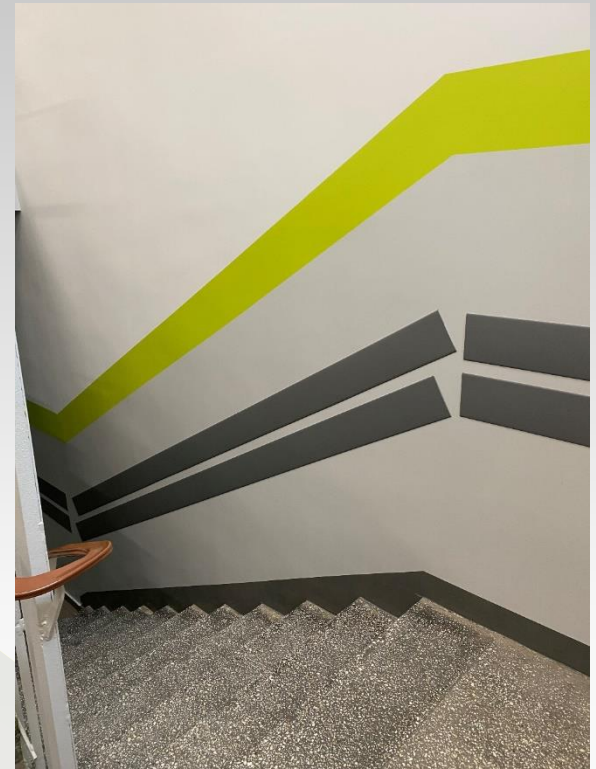

Remonty w Szkole Podstawowej w Chełmnie

⦿ Zakres zadań

Zadania obejmowały malowanie dwóch sal lekcyjnych oraz korytarzy i sali w oddziale przedszkolnym, wykonanie podestu przy wyjściu z łącznika na boisko, szlifowanie podłóg pod wykładzinę w sali oddziału przedszkolnego oraz malowanie zaplecza przyrodniczego na piętrze.



- › Termin realizacji: **lipiec – sierpień 2021 rok**
- › Wykonawca: **Firma AJKO Anna Jędrzejczak-Korpik, Lwówek**
- › Wartość robót: **59 876,75 zł**
- › Etap realizacji: **zadanie zakończone**



Remonty w Szkole Podstawowej w Chełmnie

⦿ Zakres zadań

Zadania obejmowały malowanie sali na parterze i naprawa ścian na korytarzu po zdemontowaniu pomieszczenia pracowników obsługi

- > Termin realizacji: **2021 rok**
- > Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert Korpik, Lwówek**
- > Wartość robót: **11 464,53 zł**
- > Etap realizacji: **zadanie zakończone**



Prace remontowe z Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

⦿ Zakres zadań

Zadania obejmowały remont pracowni gastronomicznej z położeniem glazury, malowanie sali lekcyjnej na ul. Wolności oraz remont sufitu w sali komputerowej w budynku LO

- › Termin realizacji: **marzec i sierpień 2021 rok**
- › Wykonawca: **ZUW Piotr Cegliński, Pniewy**
- › Wartość robót: **9 292,46 zł**
- › Etap realizacji: **zadanie zakończone**

- › Termin realizacji: **sierpień 2021 rok**
- › Wykonawca: **Usługi Remontowo-Budowlane Aga-Pio Piotr Błajet, Pniewy**
- › Wartość robót: **3 500,00 zł**
- › Etap realizacji: **zadanie zakończone**




Remont pokoi i aneksów kuchennych wychowanków Bursy Szkolnej w Pniewach

⦿ Zakres zadań

Zadania obejmowały malowanie ścian, skuwanie i wymiana glazury na ścianach i podłodze

- > Termin realizacji: **styczeń-marzec i lipiec'2021**
- > Wykonawcy: **CIS Pniewy,
REMONTBUD Sławomir Teclaw Lipnica**
- > Wartość robót (łącznie): **20 484,49 zł**
- > Etap realizacji: **zadanie zakończone**

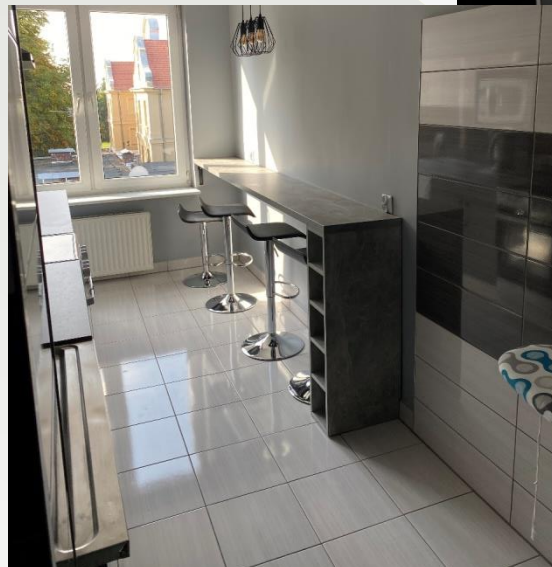

Remont pomieszczeń w Przedszkolu "MIŚ" w Pniewach

⦿ Zakres zadań


Zadanie obejmowało szpachlowanie i malowanie pomieszczeń magazynowych, korytarza w piwnicy oraz sali grupy „Zajqce”

- › Termin realizacji: **styczeń-maj 2021**
- › Wykonawca: **woźny**
- › Wartość robót: **9 311,20 zł**
- › Etap realizacji: **zadanie zakończone**



Podsumowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 r.

		Dofinansowanie	Wkład własny	Całość
1	Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej	15 069 750,04 zł	8 833 625,95 zł	23 903 375,99 zł
2	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	- zł	434 402,39 zł	434 402,39 zł
3	Referat Gospodarki Nieruchomościami	- zł	275 495,38 zł	275 495,38 zł
4	Placówki oświatowe	- zł	263 785,52 zł	263 785,52 zł
		15 069 750,04 zł	9 807 309,24 zł	24 877 059,28 zł

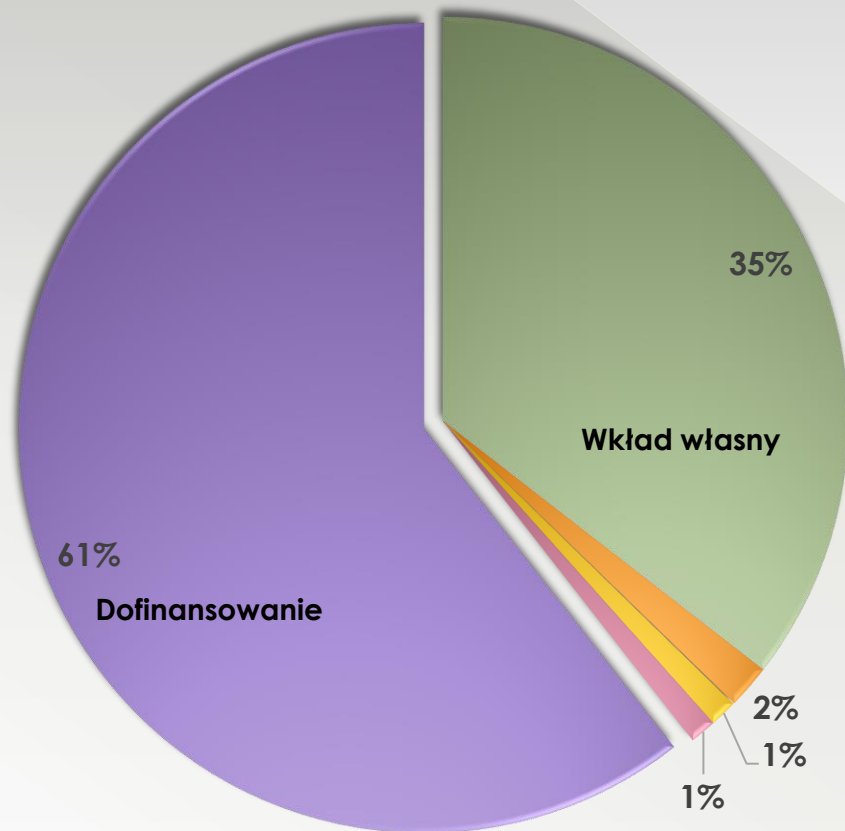

- Zadania Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
- Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
- Inwestycje placówek oświatowych
- Dofinansowanie



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

